

臺南市道路交通安全督導會報113年4月份會議紀錄

- 一、時間：中華民國113年4月30日下午5時15分
- 二、地點：臺南市政府永華市政中心6樓簡報室
- 三、主持人：黃市長偉哲(兼召集人) 紀錄：鄭文賓
- 四、出席人員：如會議簽到簿
- 五、主席致詞：感謝各小組這段期間的努力，包含停車場的建置、道路品質的提升與交通事故的降低，也請各小組持續努力，共同守護本市市民與外地遊客行的安全。
- 六、工程小組專案報告：詳會議資料。
主席裁示：洽悉。
- 七、歷次會議裁指示(決議)事項列管表：(詳會議資料)
主席裁示：
列管編號1130326-001案，有關113年「永續提升人行安全計畫」本市校園提報部分，請教育小組針對已有申請意願37校，及可能有改善需求64校，每月報告辦理進度，本案繼續列管。
- 八、各小組業務報告：(詳會議資料)
 - (一) 執法小組報告：重點工作報告(略)。
主席裁示：
 1. A1交通事故雖有減少，惟 A2交通事故仍偏高，請執法小組各分局針對易肇事故口加強執法，提高見警率。
 2. 各分局所提報不合理工程改善，112年未完成部分，請工程小組(交通局)加速辦理。
 - (二) 工程小組報告(以下主席為葉副召集人)：重點工作報告(略)。
主席裁示：洽悉。
 - (三) 教育小組報告：重點工作報告(略)。
主席裁示：洽悉。
 - (四) 監理小組報告：重點工作報告(略)。
主席裁示：洽悉。
 - (五) 宣導小組報告：重點工作報告(略)。
主席裁示：洽悉。
 - (六) 綜管小組報告：重點工作報告(略)。

主席裁示：洽悉。

(七) 總結：

林佐鼎教授：

工程小組簡報 P.50，建議於辦理情形加註申請件數與已核定件數。另該頁目前辦理情形為工程設計中，工作進度為30%應較合理。工作進度與目前辦理情形欄位填列內容應再予檢視其合理性。

鄭永祥教授：

1. 教育小組簡報 P.83，針對高齡宣導教育小組運用社大、成教班、補校等終身學習管道進行宣導，惟仍應評估各種管道宣導效益，以達成宣導效益最大化。
2. 監理小組簡報 P.93，微型電動二輪車目前大部分皆為對學校宣導場次，惟路上高齡者與移工的使用族群也不少，建請監理小組(監理站)也能平均分配前揭族群的宣導場次。

王執行秘書：

1. 有關工程小組簡報內容會後再由工程小組(交通局)主政，邀集工程小組其他單位(工務局、雲嘉南工程分局)再予研討。
2. 路老師經費申請今年與往年不同，請綜管小組(交通局)會後再向監理小組(監理站)了解目前申請進度。

殷副秘書長：

1. 微型電動二輪車目前要年滿 14歲才能騎乘，請教育小組透過學校端加強宣導。
2. 有關高齡者 A1交通事故偏高，長距離的高齡者可透過鼓勵搭乘幸福巴士，而短距離的高齡者則需透過各管道加強宣導高齡者道安觀念，如社會局透過長照中心、民政局透過區公所的區里宣導他們正確騎乘知識等。

主席裁示：

1. 微型電動二輪車外籍移工騎乘數量眾多，請監理小組(監理站)與本市勞工局合作針對各工業區外籍移工加強交安宣導。
2. 高齡交通事故亦為中央道安會報關心的議題，請各小組能透過各管道(如教育小組的成人教育班、民政局的民政系統)加強宣導。
3. 院頒初評已於4月16日辦理完畢，也請各小組依據委員建議加以

修正簡報內容，以利院頒考評為本市爭取佳績。

4. 「道路交通管理處罰條例」近期修正草案，交通部原本提出10項不開放民眾檢舉交通違規的項目，惟最終仍保留占用身心障礙車格、人行道及行穿線違停或臨停等五個項目讓民眾檢舉，請宣導小組加強對民眾宣導。
5. 本次行政院道安會報高雄市有提到向國土署申請道安繪本書的製作補助，利於後續道安宣導，後續中央尚有相關補助，也請各單位積極爭取。
6. 本市未戴安全帽而受傷的兒童數量偏高，請教育小組加強向學生家長宣導附載兒童時應落實戴安全帽的道安觀念。
7. 路老師經費因尚未核定，故許多路老師宣導活動無法推動，請監理小組(監理站)再向中央了解目前辦理進度。
8. 餘請相關單位參辦。

九、臨時動議：無

十、主席結論：略。

散會：下午6時30分。

臺南市
道路交通安全督導會報
暨安全大臺南專案會議

113年4月份會議資料



臺南市道路交通安全督導會報編印

中華民國 113 年 4 月 30 日

臺南市道路交通安全督導會報會議座次表



永華市政中心六樓簡報室

鄭永祥 教授	林佐鼎 教授	副市長	市長	殷副秘 書長	執行 秘書	警察局長

工務局									交通警察 大隊
新聞處		雲嘉南區 工程分局			工務局局長				交通警察 大隊
教育局		民政局			教育局局長				交通警察 大隊
嘉義區 監理所		經發局			研考會主委				交通警察 大隊
台南 監理站		公運處			新聞處處長				環保局
校外會		裁決中心			交通局 停工科				交通局 交管科
嘉南區 資源中心		研考會			交通局 停營科				交通局 綜規科
衛生局		車鑑會			社會局				交通局 智安科
水利局		消防局							

布幕


報告台



議程

- 兼召集人致詞
- 專案簡報(工程小組)
- 歷次會議裁指示(決議)事項列管表
- 本會報各小組報告
- 臨時動議
- 兼召集人結論

兼召集人致詞



專案簡報 (工程小組)

詳參手冊 p.4-20



工程小組專案報告

臺南市政府工務局
113年4月30日

簡報大綱

- 一、提升道路施工品質
- 二、落實橋梁安全管理
- 三、落實管線挖掘管理
- 四、強化道路及附屬設施巡查、管理維護

一、提升道路施工品質

1. 加強道路工程品質稽核：
 - 112年查核道路工程44件。
 - 113年1月迄今查核道路工程4件。



一、提升道路施工品質

2. 推動路平專案計畫：



- 112年完成路平專案工程共14標案：
- 113年路平專案工程共23標案：



北區成功路



佳里區光復路



南區濱南路

112年路平專案執行成果

預算**3.5億元**，共改善25路段(分14標案)，改善**35.82公里**，已全部完工。



歸仁區大武路(庇護島)



北區西門路(偏心式左轉)



佳里區文化路(行穿線退縮)

113年路平專案

預算3.8億元，共改善34路段(分23標案)，預計改善42.435公里，預計113年12月底完工。

編號	工程名稱	長度(M)
1	台江大道三段(曾文溪排水至安明路)路面改善工程	3,350
2	西門路(府前路至民生路)、忠義路(民生路至民族路)、府前路(南門路至東門圓環)、南門路(民生綠園至府前路)路面改善工程	1,805
3	鯤鯓路(濱南路至鯤鯓路162巷)路面改善工程	1,500
4	安明路(北汕尾路至台江大道)路面改善工程	1,750
5	東門路(崇學路至中華東路)、大同路(開山路至東門圓環)、北門路(東門圓環至公園北路)路面改善工程	2,350
6	怡安路一段(安和路至長溪路)路面改善工程	1,200
7	慶平路(建平路至國平路)及文平路(建平十七街至永華路二段)路面改善工程	2,060
8	後壁區南85線及菁寮延伸段路面改善工程	1,380
9	東山區南104-1線(1.2K至市道175線)擇要路段路面改善工程	3,000
10	安定區直加弄大道道路改善工程	1,790
11	白河區中正路(中山路~富民路)路面改善工程	610
12	學甲區興業路(台19線~大順路)路面改善工程	600
13	將軍區南24線(南19往西~都市計畫界)路面改善工程	900
14	大內區官田區南119線(市171線~南182線)路面改善工程	5,300
15	下營區南58線(南61線~台19甲)及南61線(南58線~台19甲)路面改善工程	1,700
16	官田區南62線(市176線~西庄里)及大內區南181線(6.95K~市道176線)路面改善工程	1,885
17	善化區南126線(0K~1.1K)及南122線(華瑞生態園區~高鐵橋西側)路面改善工程	2,100
18	安定區南132線(台19線~南132-1線)路面改善工程	860
19	永康區小北路(中正南路~北辰橋)路面改善工程	425
20	佳里區仁愛路及成功路(安南路~大寮排水)路面改善工程	2,090
21	新化區南168線(台19甲~南175線)及南173線擇要路段路面改善工程	2,900
22	七股區南29線(市道176~南32線)路面改善工程	1,320
23	仁德區義林路(中山路至勝利路)路面改善工程	1,560

路平專案

1. 管線挖埋整合

➢計畫路段事先邀集本市轄內各管線單開會協商，配合時程挖埋各類管線。

2. 人手孔下地

➢原則上人手孔蓋於路平專案施工前先下地。後續管線單位如有開孔需求，人手孔蓋再以新工法提升與路面齊平，減少施工對於交通的影響。



二、落實橋梁安全管理

1. 落實橋梁安全管理

- 依據交通部頒布「公路橋梁檢測及補強規範」之檢測頻率，每兩年應辦理橋梁安全檢測。
- 此外，針對部分超長或特殊性橋梁，本局每年皆會辦理橋梁安全檢測。

2. 強化危險橋梁結構安全

- 112年共維修橋梁(及地下道)共92座次。
- 113年1月迄今共維修橋梁(及地下道)共30座次。



三、落實管線挖掘管理

1. 落實道路挖掘三級品管機制

- 112年1月迄今，針對所有申請道路挖掘案件(包含施工中、完工)、民眾陳情案、媒體報載、未配合本局道挖管理政策...等案件進行抽驗，總抽驗件數計64件，罰鍰件數34件，總罰鍰金額164萬元，且皆已限期改善完畢。



三、落實管線挖掘管理

大臺南道路挖掘管理中心

- 為強化管線挖掘管理，邀集轄內主要民生管線單位進駐，如台電、台水及中華電信等，負責道挖掘案件管線協調整合等工作。

大臺南管線群組

- 可即時知道路挖掘資訊、政策宣導及缺失快速通報等。照片等資訊提供減少可能造成的誤解。



三、落實管線挖掘管理

推動無紙化

- 主要流程如右圖，其中「申請挖掘」及「竣工結案」這兩階段仍須紙本資料作為申請之依據。
- 未來規劃增加文件電子化部分，減少紙張用量。強化線上作業功能，減少紙本遞送時間，提高業務效率。



三、落實管線挖掘管理

使用者頁面改版規劃

- 提供使用者更容易了解、使用的系統介面，目前規劃改版中。



新版APP頁面

三、落實管線挖掘管理

手機APP查詢今日道挖案件

- 提供民眾查詢今日道挖案件資訊。
- 從地圖點選案件圖示，可得知基本道挖資訊，如：案號、施工單位、單位電話、許可證號、日期及地點等。



三、落實管線挖掘管理

道挖案件提供整合申請

- 為增進道挖案件的整合，提供民眾在新建房屋時可視需求提出聯合挖掘申請書。
- 除時間、地點和建照資料等之外，還提供各主要管線類型供申請人勾選，依各自情形申請需整合之項目，如此可減少反覆創鋪之情形。

臺南市新建房屋管線聯合挖掘申請書

申請人姓名：() 申請日期： 年 月 日

地址： 電話： ()

申請地點： 申請理由： (請簡述理由)

申請種類： (請勾選) 新建房屋 改建房屋 其他

申請管線種類： (請勾選)

電氣管線 給水管線 排水管線 瓦斯管線 電信管線 其他管線

申請人簽名： 申請人印章： (請蓋章)

申請日期： 2022 年 月 日

申請地點： (請填寫)

四、強化道路及附屬設施巡查、管理維護

1. 市區道路路燈之更新、改善

- 113年1月迄今路燈修復705盞、新設燈桿29桿。

2. 落實側溝附掛纜線稽查

- 113年1月迄今共抽查12次。



四、強化道路及附屬設施巡查、管理維護

3. 道路巡查手機APP


- 引用手機GPS定位及軌跡，確認道路及附屬設施損壞地點，即時派工於4小時內修復或進行安全設施圍護。



19



20



歷次會議裁指示(決議)事項列管表

詳參手冊 p.22-23

歷次會議裁指示(決議)事項列管表

列管編號1130326-001【有關「永續提升人行安全計畫」本市校園提報件數仍偏少，請教育小組再與學校確認，以加強提高申請校數。並請教育小組詳列歷年校園周邊通學步道申請的學校數。】(教育局)

□辦理情形：

- 一. 106年至112年計有71校獲得補助改善通學環境，爭取經費逾8億3仟萬元，分述如下：

年度	補助數量	補助經費
106年	3校	合計逾3.9億元
107年	3校	
108年	4校	
109年	7校	
110年	8校	
111年	11校	
112年	35校	逾4.4億元

二、本 (113) 年度辦理情形：

(一)113年「永續提升人行安全計畫」，截至113年3月底已有8校完成提案，目前送國土署審查中，提案金額逾1億3千萬。


(二)113年3月完成本市國中小校園通學環境逐校盤點：

1. 已有申請意願學校共計37校，業於113年4月9日就此37校辦理提案說明會，將予以列管，並請駐區督學持續關心提案進度。
2. 可能有改善需求學校共計64校，後續由督學列入視導，並積極輔導提案。
3. 已建置有通學步道或因校園周遭環境如校地產權、鄰近民宅或無人通行等因素而無申請需求之學校共計115所，教育局已請駐區督學再予確認，輔導學校持續優化校園周邊通學環境。

(三)教育局將依盤點結果，配合中央計畫期程，積極輔導學校申請，後續規劃提案亦請工務局及區公所持續協助。

□列管建議：本案同意解除列管。

23



執法小組報告

詳參手冊 p.25-43

臺南市政府警察局

臺南市道路交通安全督導會報暨 安全大臺南專案會報-執法小組



報告人：大隊長施衣峯

113年4月30日

簡報大綱

壹、重點工作執行情形

貳、交通事故統計分析

參、事故防制策進作為



清明節連續假期交通疏導執行概況

工作成效

墓園、納骨塔等祭祀場所交通順暢

「紅球臺南」活動、水交社兒童節市集活動交通順暢

成立 LINE 群組加強與各機關橫向聯繫(如國道交控中心、市府交控中心等)，遇有交通壅塞及重大事故，即時傳遞訊息通報、協調及處置。

本局統計清明連假期間(4/3-4/7)，計派遣交通崗148處，出勤警力數2,347人次、協勤義交132人次，機動調整警力增加見警率，另全時段監控掌握路況，有關各項活動、交通管制及相關乘車與停車資訊，透過警廣協助推播14次予旅客知悉。



清明連續假期交通疏導作為新聞露出

本次清明連假本局交通疏導新聞露出皆為正面輿情，無負面輿情。

連假追紅球南警交通疏導

四天假期市區估滿觀光人潮 策展地點及周邊道路將加強管制、取締酒駕

清明連假替代道路避塞車雷區

清明連假即將展開 台南永康、玉井警分局

清明連假第2天上午 台南湧入近5萬人次

清明連假警積極整備提供順暢交通服務

清明連假出遊避車潮 南市警推估塞車時間路段一次看

清明連假來安平玩 這樣走免塞車

「加強取締重大交通違規計畫」執行情形

113年4月16日中央道路交通安全會報，113年1至3月份「加強取締重大交通違規計畫」執行情形，其中六都達標單位計有：**臺北市、桃園市、臺南市**，本局將持續加強取締重大交通違規，以減少交通事故發生，確保用路人行車安全。



加強取締酒後駕車

項目	本期 113年3月	近三年 同期平均 110、111及112年3月	與近三年 同期比較增減
取締件數	416	712	-296 (-41.57%)
其中 肇事舉發 A1+A2+A3	88	93	-5 (-5.38%)
攔查取締	328	619	-291 (-47.01%)
死傷人數	82	86	-4 (-4.65%)



持續加強執法

落實防制酒駕


113年1月道路交通事故30日內死亡情形

月份\類別	113年	112年	與同期比較	前三年平均數	與前三年同期比較
	人	人	人	人	人
一月	21	30	-9	28.33	-7.33
二月					
三月					
四月					
五月					
六月					
七月					
八月					
九月					
十月					
十一月					
十二月					
合計	21	30	-9	28.33	-7.33

◎交通部道安資訊查詢網目前僅公布至113年1月

113年1月六都道路交通事故30日內死亡情形

局別	113年1月	112年1月	同期比較	
	人數	人數	人數	人數增減率
臺北市	8	8	0	0.0%
新北市	22	25	-3	-12.0%
桃園市	24	26	-2	-7.7%
臺中市	28	25	3	12.0%
臺南市	21	30	-9	-30.0%
高雄市	38	25	13	52.0%

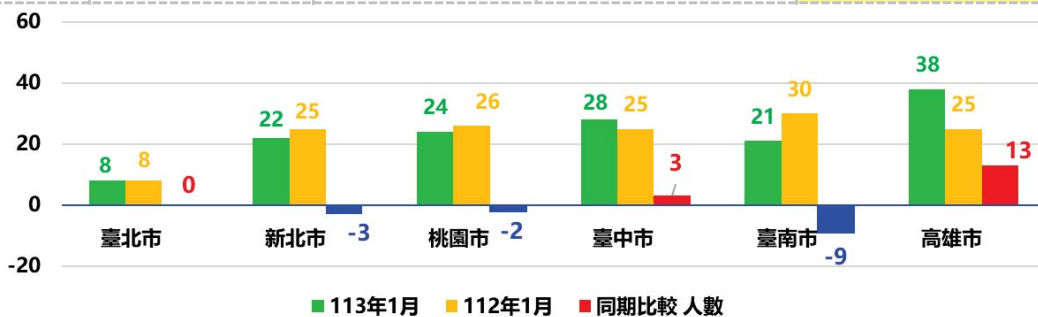

◎交通部道安資訊平臺目前僅公布至113年1月。

113年1月1日至4月14日A1類情形

月份\類別	113年		112年		同期比較		前三年平均數		前三年同期比較	
	件	人	件	人	件	人	件	人	件	人
一月	14	14	22	24	-8	-10	18.00	19.00	-4.00	-5.00
二月	12	12	21	23	-9	-11	17.00	19.67	-5.00	-7.67
三月	7	7	13	13	-6	-6	13.67	14.33	-6.67	-7.33
四月 (4月14日止)	2	2	4	4	-2	-2	5.00	5.00	-3.00	-3.00
五月										
六月										
七月										
八月										
九月										
十月										
十一月										
十二月										
合計 (4月14日止)	35	35	60	64	-25	-29	53.67	58.00	-18.67	-23.00

33

113年1月1日至4月14日A1類情形

本局A1事故發生35件、35人，分析指標項目如下：

- 一、**機車**：27件，佔77.1%(其中**高齡者**10件，佔37%)。
- 二、**高齡者**：17件，佔48.6%(其中騎乘機車未戴安全帽3件，佔17.6%)。
- 三、**自撞(摔)**：10件，佔28.6%(其中**高齡者**2件，佔20.0%)。
- 四、**雙方涉無適格駕照**：5件、5人，件數佔14.3%(其中**高齡者**2件、2人，件數佔40.0%)。
- 五、**75歲以上高齡駕駛者**：4件、4人，件數佔11.4% (其中**駕籍逾期者**3件、3人，件數佔**75.0%**)。
- 六、**行人**：4件，佔11.4%(其中**高齡者**4件，佔100.0%)。

34

113年1-3月六都A1類道路交通事故每月件數比較

月份/類別	113年1-3月						112年1-3月						與去年同期比較					
	臺北市	新北市	桃園市	臺中市	臺南市	高雄市	臺北市	新北市	桃園市	臺中市	臺南市	高雄市	臺北市	新北市	桃園市	臺中市	臺南市	高雄市
一月	5	12	12	12	14	17	6	13	16	12	22	13	-1	-1	-4	0	-8	4
二月	8	14	14	12	12	11	9	9	10	12	21	16	-1	5	4	0	-9	-5
三月	9	10	9	10	7	8	12	18	14	19	13	15	-3	-8	-5	-9	-6	-7
四月																		
五月																		
六月																		
七月																		
八月																		
九月																		
十月																		
十一月																		
十二月																		
合計	22	36	35	34	33	36	27	40	40	43	56	44	-5	-4	-5	-9	-23	-8

◎以上資料由內政部警政署交通事故案件處理系統查詢，未對外公布

A1類：(一)113年3月計發生7件7人，較去年同期減少6件減少6人。

(二)與去年同期相比，其中永康分局增加2件最多；白河、善化、新化分局各增加1件次之。

單位/項目	113年3月		112年同期		同期比較		113年1月1日至4月14日		112年同期		同期比較		增減比例		112年總人數
	件	人	件	人	件	人	件	人	件	人	件	人	件	人	
新營分局	0	0	3	3	-3	-3	2	2	5	5	-3	-3	-60.0%	-60.0%	15
白河分局	1	1	0	0	1	1	5	5	2	2	3	3	150.0%	150.0%	13
麻豆分局	0	0	2	2	-2	-2	6	6	8	9	-2	-3	-25.0%	-33.3%	20
佳里分局	0	0	2	2	-2	-2	0	0	4	4	-4	-4	-100.0%	-100.0%	10
學甲分局	0	0	1	1	-1	-1	2	2	5	7	-3	-5	-60.0%	-71.4%	14
善化分局	2	2	1	1	1	1	6	6	6	7	0	-1	0.0%	-14.3%	15
新化分局	1	1	0	0	1	1	3	3	1	1	2	2	200.0%	200.0%	11
歸仁分局	0	0	2	2	-2	-2	3	3	9	9	-6	-6	-66.7%	-66.7%	21
玉井分局	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	-100.0%	-100.0%	2
永康分局	2	2	0	0	2	2	4	4	5	5	-1	-1	-20.0%	-20.0%	10
第一分局	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	100.0%	100.0%	6
第二分局	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100.0%	100.0%	3
第三分局	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	-8	-8	-100.0%	-100.0%	21
第四分局	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	-100.0%	-100.0%	3
第五分局	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1	-1	-100.0%	-100.0%	8
第六分局	1	1	2	2	-1	-1	1	1	3	3	-2	-2	-66.7%	-66.7%	4
合計	7	7	13	13	-6	-6	35	35	60	64	-25	-29	-41.7%	-45.3%	176

113年1-2月A2類道路交通事故案件同期比較

月份\類別	113年		112年		同期比較		同期比較增減率	
	件	人	件	人	件	人	件	人
一月	4,219	5,666	3,798	5,153	421	513	11.1%	10.0%
二月	3,464	4,809	3,522	4,787	-58	22	-1.6%	0.5%
三月								
四月								
五月								
六月								
七月								
八月								
九月								
十月								
十一月								
十二月								
合計	7,683	10,475	7,320	9,940	363	535	5.0%	5.4%

◎以上資料由內政部警政署交通事故案件處理系統查詢，未對外公布

37

113年1-2月六都A2類道路交通事故總受傷件數、人數比較

局別	113年1-2月		112年1-2月		與去年同期比較		與去年同期比較增減率	
	件	人	件	人	件	人	件	人
臺北市	3,602	4,839	3,914	5,232	-312	-393	-8.0%	-7.5%
新北市	7,163	9,728	7,754	10,525	-591	-797	-7.6%	-7.6%
桃園市	7,394	9,623	7,949	10,389	-555	-766	-7.0%	-7.4%
臺中市	12,120	16,267	11,498	15,431	622	836	5.4%	5.4%
臺南市	7,683	10,475	7,320	9,940	363	535	5.0%	5.4%
高雄市	5,462	7,830	6,402	9,124	-940	-1,294	-14.7%	-14.2%
全國	64,974	87,601	66,313	89,318	-1,339	-1,717	-2.0%	-1.9%

◎以上資料由內政部警政署交通事故案件處理系統查詢，未對外公布

38

113年1-2月六都A2類道路交通事故每月件數比較

月份\類別	113年件數						112年件數						與去年同期比較					
	臺北市	新北市	桃園市	臺中市	臺南市	高雄市	臺北市	新北市	桃園市	臺中市	臺南市	高雄市	臺北市	新北市	桃園市	臺中市	臺南市	高雄市
一月	2,043	3,926	4,162	6,882	4,219	3,019	1,988	4,100	4,050	6,002	3,798	3,721	55	-174	112	880	421	-702
二月	1,559	3,237	3,232	5,238	3,464	2,443	1,926	3,654	3,899	5,496	3,522	2,681	-367	-417	-667	-258	-58	-238
三月																		
四月																		
五月																		
六月																		
七月																		
八月																		
九月																		
十月																		
十一月																		
十二月																		
合計	3,602	7,163	7,394	12,120	7,683	5,462	3,914	7,754	7,949	11,498	7,320	6,402	-312	-591	-555	622	363	-940

◎以上資料由內政部警政署交通事故案件處理系統查詢，未對外公布

A2類：(一)113年2月計發生3464件4809人，較去年同期減少58件增加22人。

(二)與去年同期相比，以歸仁分局增加45件最多；件數及人數比例增加較多分局，依序為新營分局(+27件、+16.1%)、麻豆分局(+22件、+15.8%)、歸仁分局(+45件、+15.8%)、佳里分局(+12件、+6.6%)、白河分局(+3件、+6.3%)。

單位/項目	113年2月		112年2月同期		同期比較		增減比例	
	件	人	件	人	件	人	件	人
新營分局	195	275	168	223	27	52	16.1%	23.3%
白河分局	51	69	48	66	3	3	6.3%	4.5%
麻豆分局	161	219	139	173	22	46	15.8%	26.6%
佳里分局	195	276	183	239	12	37	6.6%	15.5%
學甲分局	41	52	41	50	0	2	0.0%	4.0%
善化分局	289	405	321	434	-32	-29	-10.0%	-6.7%
新化分局	78	105	85	105	-7	0	-8.2%	0.0%
歸仁分局	330	473	285	395	45	78	15.8%	19.7%
玉井分局	18	23	22	31	-4	-8	-18.2%	-25.8%
永康分局	519	721	565	793	-46	-72	-8.1%	-9.1%
第一分局	368	530	408	562	-40	-32	-9.8%	-5.7%
第二分局	287	404	302	432	-15	-28	-5.0%	-6.5%
第三分局	300	428	309	432	-9	-4	-2.9%	-0.9%
第四分局	103	153	102	126	1	27	1.0%	21.4%
第五分局	292	356	320	416	-28	-60	-8.8%	-14.4%
第六分局	237	320	224	310	13	10	5.8%	3.2%
合計	3464	4809	3522	4787	-58	22	-1.6%	0.5%

113年2月A2類情形

本市113年2月份A2類交通事故發生3,464件4,809人，較去年同期減少58件增加22人，分析事故各類指標如下：

一、前三大肇因：

- (一)未依規定讓車 (較去年同期減少106件，減少12.0%)。
- (二)未注意車前狀況 (較去年同期減少216件，減少29.0%)。
- (三)左轉彎未依規定 (較去年同期減少65件，減少30.4%)。

二、**年齡**：分析113年65歲以上**高齡者**A2類986件，較去年同期增加73件，增加8.0%。

三、**無適格駕照**：分析113年無適格駕照A2類504件，較去年同期減少85件，減少14.4%。

重點工作宣導

多元管道 重點宣導

社區宣導



結合社會局、監理站在埤頭里辦理**高齡交通安全宣導**，並接受電視台採訪，加強播送高齡者交通安全觀念。

藝文宣導



在學甲宅港國小102周年校慶設攤，並自繪宣導圖文，宣導「行人走斑馬線」、「高齡交安」等觀念。

紅球宣導



前往安平古堡「紅球計畫」設攤宣導，向民眾宣導「行人路權」、「喝酒找代駕」交安觀念。

大車宣導




至台電新營營業區辦理**大型車體驗宣導**，加深該公司員工對「內輪差」、「視野死角」危險性的認識。

簡報完畢

恭請指示

43




工程小組報告

詳參手冊 p.45-62

113年4月份道安會報暨安全大臺南專案會議 工程小組工作報告

報告單位：工程小組

112-113跨年度工程小組工作計畫藍圖

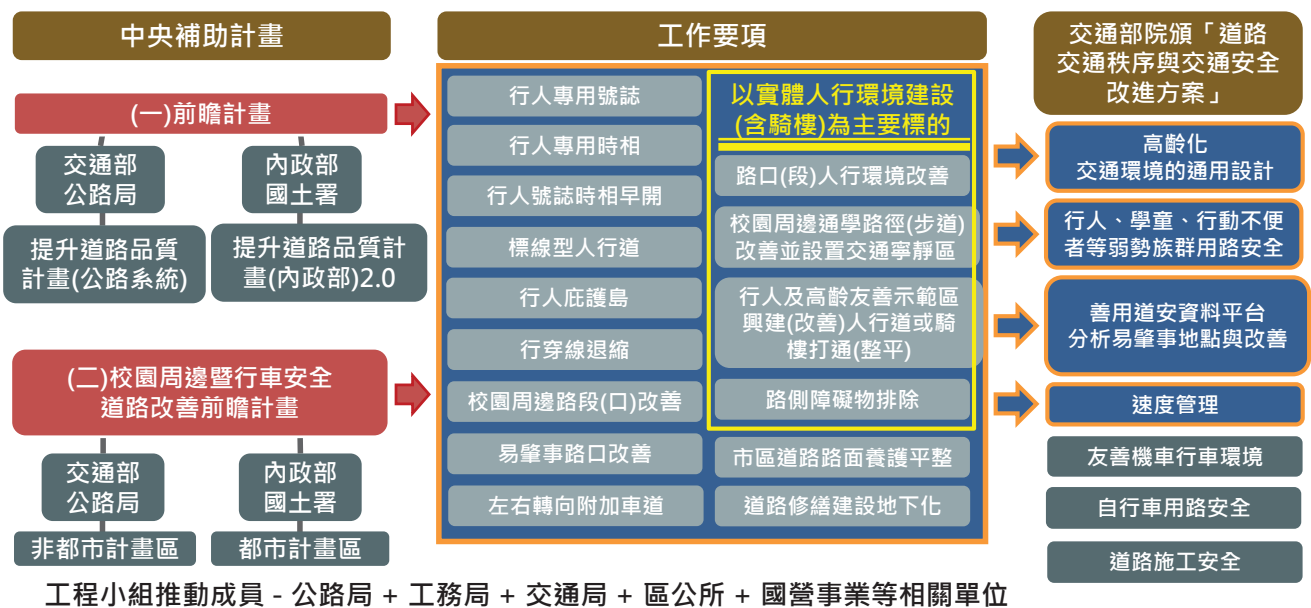

112-113跨年度提升交通安全經費爭取情形(1/2)

工務局112-113跨年度案件統計

計畫名稱		補助單位	已核定 案件數	中央(補)/地方(自) 經費(萬元)	提案待核定 案件數
前瞻計畫	提升道路品質計畫 (內政部)2.0	內政部國土署	25件	中央(補)36,635.2 地方(自) 8,043.6	0件
	提升道路品質計畫 (公路系統)	交通部公路局	3件	中央(補)6,000 地方(自)1,317	0件
校園周邊暨 行車安全 道路改善	非公路系統之道路	內政部國土署	27件	中央(補)31,192.6 地方(自) 6,847.8	0件
	公路系統之道路	交通部公路局	0件	中央(補)0 地方(自)0	3件
合計			55件	中央(補)73,827.8 地方(自)16,208.4	3件

47

112-113跨年度提升交通安全經費爭取情形(2/2)

交通局112-113跨年度案件統計

計畫名稱		補助單位	已核定 案件數	中央(補)/地方(自) 經費(萬元)	提案待核定 案件數
校園周邊暨 行車安全 道路改善前 瞻計畫	非公路系統之道路	內政部國土署	3件	中央(補)4,929.3 地方(自)1,100.7	0件
	公路系統之道路	交通部公路局	1件	中央(補) 774.08 地方(自) 169.92	0件
合計			4件	中央(補)5,703.38 地方(自)1,270.62	0件

48

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善 -提升道路品質計畫(1/2)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 ✓ 提升道路品質計畫(內政部)2.0 (非公路系統之道路) ➤ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➤ 核定補助25案 ✓ 中華東路、高鐵特定區、健康路、北安路、台江大道、裕信路、大林路等25案道路改善工程 ➤ 工作要項 ✓ 人行道設置改善 ✓ 路口安全改善 ✓ 路面刨鋪改善 	工務局	25	6	40%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 進度：規劃設計中16案，施工中3案，已完成6案。 2. 視個案規模不同，預計於113年底至114年陸續完工。

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善 -提升道路品質計畫(2/2)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 ✓ 提升道路品質計畫(公路系統) (公路系統之道路) ➤ 補助單位 ✓ 交通部公路局 ➤ 申請提報3案 ✓ 佳里七股南37線、麻豆市道171線、七股西港麻豆市道173線，共3案道路改善工程 ➤ 工作要項 ✓ 路面刨鋪改善 	工務局	3	0	N	<ol style="list-style-type: none"> 1. 進度：工務局於113年1月25日向交通部公路局提案。 2. 已於113年3月22日核定。 3. 目前辦理工程設計中。

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善 -校園周邊通學步道(1/2)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
3	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 計畫名稱 ✓ 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 (非公路系統之道路) ▶ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ▶ 核定補助27案(共30校通學步道) ✓ 大山國小、五王國小、善化高中、臺南高商、南英工商、臺南神學院、協進國小、海佃國中、學甲國小、嘉南國小、新進國小、裕文國小、德高國小、安南國中、新營高工、信義國小、永信國小、下營國小、山上國中、六甲國小、公園國小、楠西國中、楠西國小、日新國小、小新國小、新民國小、安順國小、東陽國小、忠孝國中、臺南女中 ▶ 工作要項 ✓ 通學步道設置 ✓ 路口安全改善 	工務局	4	0	40%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 進度：規劃設計中19案發包中5案，施工中3案 2. 視個案規模及獲核定時間不同，預計於113年底至114年陸續完工。
		區公所	12	0		
		學校	11	0		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善 -校園周邊通學步道(2/2)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
4	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 計畫名稱 ✓ 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 (公路系統之道路) ▶ 補助單位 ✓ 交通部公路局 ▶ 申請提報校園(3校) ✓ 善化區善化國中、下營區中營國小、安定區南安國小 ▶ 工作要項 ✓ 通學步道設置 	工務局	0	0	N	<ol style="list-style-type: none"> 1. 進度:公路局辦理審議中 2. 預計於113年度核定，114年施工及完工。

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善 -易肇事路口改善計畫-第1次補助(1/3)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 ✓ 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 (針對校園周邊路口改善) (非公路系統之道路) ➤ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➤ 申請提報路口(4處) ✓ 安南區安明路四段/安中路六段路口 ✓ 安南區安吉路一、二段/本原街一、二段路口 ✓ 安南區北安路三段/培安路口 ✓ 歸仁區市道182線/台39線路口 ➤ 工作要項 ✓ 削切中央分隔島，增設左轉車道 ✓ 既有設施移設(含號誌桿、路燈、路樹、警局監視系統等) ✓ 號誌管線重整 ✓ 增設行人號誌燈 ✓ 全路口刨鋪及標線重繪 	交通局	1	0	60%	1. 進度無落後。 2. 刻正辦理施工中。

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善 -易肇事路口改善計畫-第2次補助(2/3)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
6	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 ✓ 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 (針對校園周邊路口改善) (非公路系統之道路) ➤ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➤ 申請提報路口(2處) ✓ 東區東門路三段/自由路三段/自由路二段路口 ✓ 安平區永華路二段/健康三街路口 ➤ 工作要項 ✓ 削切中央分隔島，增設左轉車道 ✓ 既有設施移設(含號誌桿、路燈、路樹、警局監視系統等) ✓ 號誌管線及行人號誌改善工程(含路面改善工程) ✓ 標誌標線重繪及改善工程 ✓ 復舊工程(AC重鋪) 	交通局	1	0	60%	1. 進度無落後。 2. 刻正辦理施工中。

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善 -易肇事路口改善計畫(3/3)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
7	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 計畫名稱 ✓ 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 (針對校園周邊路口改善)(公路系統之道路) ▶ 補助單位 ✓ 交通部公路局 ▶ 申請提報路口(10處) ✓ 學校出入口 <ul style="list-style-type: none"> • 新營區新生國民小學北入口(南73與農路口)、太子國民中學正門口、新橋國小正門口、後壁區後壁國中大門前道路與南81線路口、七股區南38線竹橋國中門口、西港區後營國小後門、柳營區台1線與新榮高中大門口、善化區台19甲線善化國中前 ✓ 易肇事/瓶頸路口 <ul style="list-style-type: none"> • 鹽水區南74線與南80線路口 ✓ 醫院出入口 <ul style="list-style-type: none"> • 關廟區吉安醫院(關廟區中正路435號)門口 ▶ 工作要項 ✓ 增設行車管制號誌 ✓ 增設行人專用號誌 ✓ 行人燈箱加大及繪設行穿線 	交通局	1	0	60%	1. 進度無落後。 2. 刻正辦理施工中。


工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程發包(20%)、工程設計(20%)、工程施工進度(40%)

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善 -A 規劃設計類-臺南市友善安全交通環境改善示範計畫

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
8	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 計畫名稱 ✓ 臺南市友善安全交通環境改善示範計畫 ▶ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ▶ 申請提報計畫路段(3處路段) ✓ 中西區中正路(西門路至民生綠園，共620公尺) ✓ 中西區中山路(民生綠園至北門路，共1,110公尺) ✓ 東區凱旋路(東寧路201巷至中華東路一段，共795公尺) ▶ 工作要項 ✓ 推動行人優先交通安全，提供完善安全的行人通行環境，檢討道路斷面配置 ✓ 實地調查與測量、基地環境與人文調查分析、整體發展構想與細部規劃設計研擬作業、施工細部圖說製作及工程經費預估等 	交通局	1	0	30%	1. 進度無落後。 2. 刻正辦理公開招標中。

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

113年度工程小組工作計畫藍圖

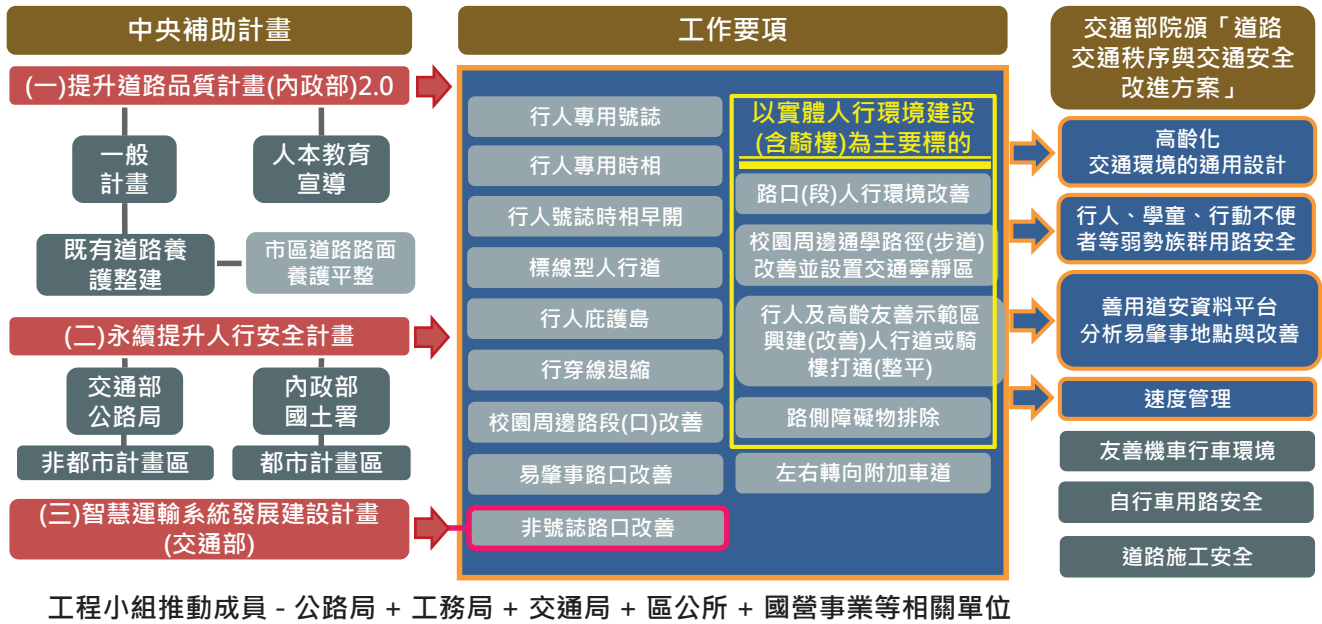

113年度提升交通安全經費爭取情形

工務局/交通局聯合案件統計

計畫名稱	補助單位	已核定案件數	中央(補)/地方(自)經費(萬元)	提案待核定案件數
永續提升人行安全計畫	內政部國土署	1件	中央(補)4,800 地方(自)0	22件
智慧運輸系統發展建設計畫	交通部	0件	中央(補)0 地方(自)0	1件
合計		1件	中央(補) 4,800 地方(自)	1件

113年度永續提升人行安全計畫 -交通部/本局盤點行人易肇事路口

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 ✓ 「永續提升人行安全計畫」路口改善案 (非公路系統之道路) ➤ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➤ 申請提報路口(24處) ✓ 東區中華東路二段/中華東路二段295巷、南區中華西路一段/新孝路、中華西路一段/新信路等24處路口 ➤ 工作要項 ✓ 車道瘦身，削切中央分隔島，增設左轉車道 ✓ 既有設施移設(含號誌桿、路燈、路樹等) ✓ 增設行人庇護島、行穿線退縮 ✓ 行人標誌標線號誌改善工程(含路面改善工程) ✓ 強化無障礙設計與設施 ✓ 擴大路口人行道及建置停等安全空間 	工務局 交通局	1	0	30%	1. 進度無落後。 2. 刻正辦理工程設計中。

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

113年度智慧運輸系統發展建設計畫 -非號誌化路口主動式風險感知警示系統建置計畫

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 ✓ 臺南市非號誌化路口主動式風險感知警示系統建置計畫 ➤ 補助單位 ✓ 交通部 ➤ 申請提報路口(3處) ✓ 善化區市道178線(興農路)/區道南128-1線路口 ✓ 善化區三民路/善美大道路口 ✓ 善化區中正路66巷/重劃區農路路口 ➤ 工作要項 ✓ 建置非號誌化路口主動式風險感知警示系統，警示衝突方向之車輛，促使其進行必要的減速或停讓動作，避免交通事故的發生，提高非號誌化路口安全的目標 	交通局	0	0	N	1. 進度:已函報交通部辦理審議核定中。 2. 預計於113年度核定，113年施工及完工。

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

113年度優化人行道環境(含騎樓整平)


編號	工作要項	負責局處	目標數量	完成數	工作進度	目前辦理情形
1	人行道障礙物遷移 (如電桿、電箱)	工務局	82處	20處	24%	協調人行道上障礙物業管單位辦理遷移。
2	人行道改善 (如延長、整平、加寬等)	工務局	14,823公尺	8,814公尺	59.5%	高鐵特定區周邊改善完成6,579公尺、民治市政中心周邊人行道改善完成992公尺、 高鐵大道改善完成1,243公尺
3	騎樓整平長度(公里) (前瞻基礎建設提升道路品質計畫2.0)	工務局	600公尺	218公尺	36.3%	112年度目前施工中，113年度已提案。

61

113年度強化人行安全設施重點工作

編號	工作要項	負責局處	年度目標(處)	年度累計(處)	3月完設(處)	工作進度	本市累計(處)	目前辦理情形
1	行人專用號誌	(交)	80	0	0	10%	1,368	已盤點路口70、派工30，預計6月完成
2	行人專用時相	(交)	50	0	0	10%	140	已盤點路口40、派工20，預計6月完成
3	行人號誌時相早開	(交)	150	0	0	10%	330	已盤點路口120、派工50，預計6月完成
4	標線型人行道	(交)	15	2	2	23%	46	已盤點數量10、派工10，預計6月完成
5	綠底行穿線	(交)	5	1	1	20%	1	已盤點數量3、派工3，預計5月完成
6	行人庇護島	(交)	8	0	0	10%	44	已盤點路口4、派工4，預計6月完成
		(工)	2	0	0	10%		持續盤點、施工中
7	行穿線退縮	(交)	10	0	0	10%	116	已盤點路口5、派工5，預計5月完成
		(工)	5	0	0	10%		持續盤點、施工中

62



教育小組報告

詳參手冊 p.64-84



臺南市道安會報

教育小組報告



113年4月30日

報告大綱

壹

院頒計畫執行情形



- 一、創造國中小學良好通學步行環境，增進學生通學安全
- 二、交通安全教案與教材，落實推廣至校園
- 三、推廣落實交通安全守則
- 四、提升各級學校重視交通意外傷亡與防制策進作為



貳

3月執行成果



壹

院頒計畫執行情形

一、創造國中小學良好通學步行環境，增進學生通學安全

積極改善學校周邊易肇事路口

跨局處會勘盤點國高中小校園周邊交通環境

- 112年列管94校，已改善90校；113年列管95校，已改善35校



跨局處會勘、輔導團協助

106-111年提升道路品質計畫，112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫


- 提升道路品質計畫獲核定補助計有36校，總經費約3億9千萬元。截至3月已有31校完工，預計113年7月全數完工。
- 112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫，核定35校，核定金額逾4億4千萬元整，陸續完成工程書圖審查、招標，施工中。



跨局處會勘、輔導團協助



新進國小通學步道改善工程
施工中

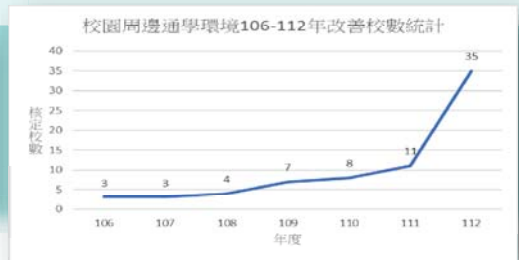

113-116永續提升人行安全計畫

- 截至113年3月有8校完成提案，提案金額逾1億3千萬元。
- 113年3月完成本市國中小校園通學環境普查，計37校有申請意願。
- 113年4月9日邀集工務局、交通局及有提案經驗學校，就有申請意願學校，辦理提案說明分享會議，積極輔導學校提案。

67

二、交通安全教案與教材，落實推廣至校園



多元方式增進教師熟悉教育部交通安全課程模組並運用

- 交通安全教育課程，112學年度以納入校訂課程或融入部定課程方式執行，各校完成率已達100%。
- 113年度預計辦理預計辦理教師增能研習14場次，已辦理112學年交通安全教育輔導團暨教師增能計畫，共計2場次共計128人次參與。
- 112學年度交通安全教育輔導團-課程模組推廣到校服務截至113年1-3月預計辦理3場次，計約120人參與，已辦理2場次約70人次參與。
- 擇定忠孝國中等10校為課程模組前導學校，將經驗傳承逐步推動各校研發具特色交通安全校訂課程，目前進度80%。
- 截至113年3月：
 - 磨課師平臺交通安全數位研習共133校，計614人次
 - 各校自辦交通安全研習，共計有文昌國小等20場次，共計649人次，研習內容為交通安全課程模組及交安五守則。



3月辦理交通安全
環境建置師資培訓



擇定10所前導學校
試行課程模組

目標交通安全教育納入課程計畫，各級學校100%執行

68

三、推廣落實交通安全守則



運用多元管道加強宣導

- 交通安全守則除納入課程外，亦結合學校實體情境、班親會、親職講座、校慶運動會、學校網頁、粉絲專頁、跑馬燈等多元管道。
- 結合親職教育、家庭教育，交通安全素養落實於生活中。

結合戶外教育辦理交通安全活動課程

- 補助各校申請辦理**自行車模擬考照及自行車自行車道路騎乘實作教學**，113年預計辦理**20場次**，並鼓勵**結合本市自行車道**。
- 補助學校辦理**戶外教育結合交通安全教育參訪計畫**，參訪**交通安全主題館、監理站**，113年預計辦理**20場次**，鼓勵師生共同參與。



自行車安全教育課程

高齡者交通安全教育與宣講

- 樂齡學習中心課程持續融入交通安全議題，113年預計辦理**100場次**，受益長輩約**3500人次**。學校長輩交通安全關懷系列宣導
- 辦理「臺南市112年度高齡者交通安全教育推廣計畫」，路老師團隊至各地進行宣講，113年預計辦理**100場次**，受益長輩約**3500人次**。
- 擬定各校長輩交通安全關懷系列宣導，至113年3月已宣導**822場次**。



四、提升各級學校重視交通意外傷亡與防制策進作為

針對不同階段別多元強化宣導及防制重點

- 幼兒園：交通安全5守則宣導、幼兒乘車安全教育、幼兒專用車巡檢等。
- 國中小：交通安全5守則宣導、行人安全教育、乘客安全教育、大車內輪差、自行車安全教育、無照駕駛防制、微型電動二輪車教育、導護志工招募等。
- 高中職：交通安全5守則宣導、自行車安全教育、機車安駕、大客車乘車安全等。
- 大專院校：交通安全5守則宣導、汽機車安全駕駛、酒駕防制、口停讓教育等。
- 高齡教育：交通安全5守則宣導、結合樂齡、補校、成教班等終身學習管道，強化高齡交通安全教育等。



結合公私資源、運用學校運用電視牆、運用跑馬燈進行宣導


貳

3月執行成果

3月份國中小學生交通意外事件分析

📢 🌟 國小校園交通意外事件

113年每月統計-國小								
類型/月	電動自行車	自行車	載送-機車	載送-汽車	機車-無照	機車-有照	步行	合計
3月			5				2	7

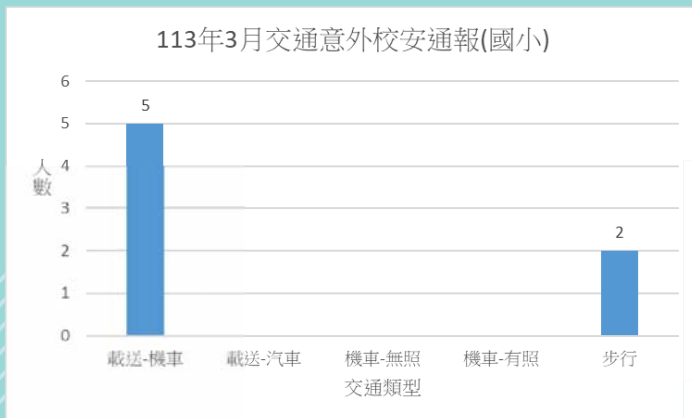

資料來源：校安通報



因應機車接送事故多

1. 加強親職教育宣導
2. 落實交通安全課程模組—機車乘客安全


3月份國中小學生交通意外事件分析



國中校園交通意外事件

類型/月	電動自行車	自行車	載送-機車	載送-汽車	機車-無照	機車-有照	步行	合計
3月	1	10	2		2		1	16

自行車事故原因/月	自撞	自摔	自VS汽車	自VS機車	自VS自	學校通報未敘明	合計
3月	0	2	2	5	1		10



資料來源：校安通報

學生自行車安全教育重點：

- 1.自行車正確用路及騎乘觀念—**建立學生為慢車駕駛人的觀念。**
- 2.危險預防及防禦駕駛觀念—**騎乘自行車要注意車前狀況，避免危險。**



自行車安全教育課程

一、創造國中小學良好通學步行環境，增進學生通學安全



跨局處合作、協助學校規劃建置完善的通學環境



邀請本府工務局、交通局
合作辦理說明會



邀請提案學校—東興國小
分享提案經驗



邀請提案學校—南安國小
分享提案經驗

輔導團協助、跨局處會勘規劃改善通學環境

- 1.普查各校通學環境，**有申請意願計37校。**
- 2.本局於113年4月9日邀集工務局、交通局，並邀請有提案經驗學校，跨局處合作辦理提案說明會。
- 3.教育局將積極提供必要協助輔導學校提案。
- 4.截至113年2月底已提案申請**113年永續提升人行安全計畫學校共計8案。**

二、交通安全教案與教材，落實推廣至校園



教材推廣、師資研習、課程前導學校試行

- 113年3月辦理東陽國小等**1場次輔導團到校諮詢服務**，帶領教師運用交通安全課程模組，計有**50人次**參與。
- 交通安全資源網公告交通安全課程模組教學PPT，即時提供教材資訊。
- 於**113年3月**辦理輔導團暨教師增能研習環境建置場次，計有**128人次**參與。
- 鼓勵參與教育部交通安全研習，
 - 磨課師平臺交通安全數位研習113年3月共約58校，約有500人次參與。
 - 各校自辦研習，113年3月計有文昌國小等10場次，約有239人參與。



各校進行課程模組融入校定課程



前導試行學校課程執行



即時提供各校最新教材資訊

75

三、辦理幼童專用車、補習班交通車等稽查



113年3月計查核**10場次**、**18輛車**

超載、車體是否變更、幼童專用車是否違規負載學齡兒童等稽查

幼童專用車察查及宣導

補習班交通車



幼童車



高中校車



3月份查無違規事項



會同校外會、監警單位稽查交通車

76

四、校園交通安全教育宣導



活動出發 培養交通安全素養

- 各校辦理「交安有品」宣導，3月主題：「不撞行人、迅速逃生、方便充電」交通安全教育週宣導，逾274場次。
- 各校結合上放學及各項親職活動進行交通安全宣導。
- 各教育階段依學生事故分析結果，加強重點教育課程及宣導。



跨局合作於活動時設攤親職宣導



天天5守則 結合路口導護宣導



結合社會資源--桂盟國際 (KMC) 自行車安全教育宣導



結合警察局辦理
微型電動二輪車安全宣導



國中加強自行車安全教育宣導



國小加強乘客安全教育宣導

五、社會交通安全教育宣導



運用網路媒體、跑馬燈等進行交通安全社會教育宣導

- 各校結合校慶加強親職教育宣導。
- 設置高齡交安專區，持續請各校加強樂齡教育宣導，指導學生關懷家中長者交通安全。
- 各校借由學校網站、學校相關文宣進行教育宣導，受眾普及親師生。



運用學校相關網站進行交安5守則宣導



結合校慶活動交通安全親職教育宣導




交安資源網設置高齡交安專區
—請學校持續宣導關懷家中長輩交通安全

六、高中職學生交通意外事件分析



113年3月份高中職學生交通意外事件分析

類型/月	電動自行車	自行車	機車_有照	機車-無照	步行	合計
3月	0	0	3	6	0	9

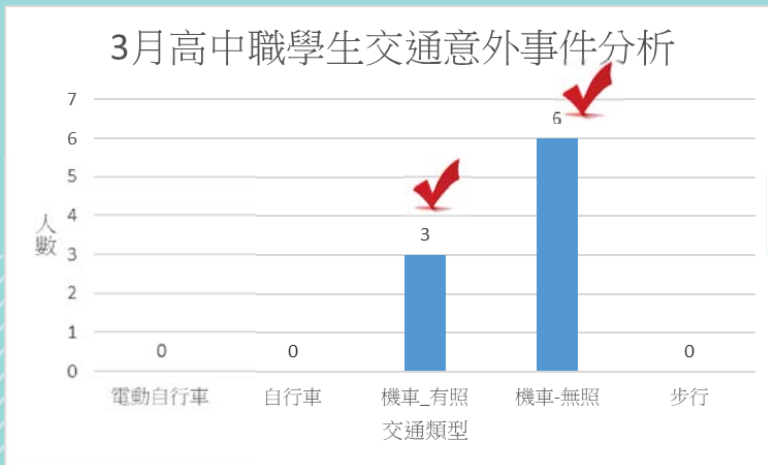

資料來源：校外會



結合警察局辦理機車安駕宣導



辦理大客車內輪差宣導

七、高中職3月學生交通安全宣導成效



高中職以機車駕駛、自行車交通事故居冠

- 學校依案件進行輔導及防制措施
- 學校集會時間實施交通安全教育宣導計77場次，7萬7,174人次
- 聯巡出勤人數104人次，計警察45人次、教官29人次，教師30人次
- 實施校外聯合巡查：計36場



高中職學校辦理路口停讓、機車安駕宣導宣導等

八、大專院校3月學生交通安全宣導成效



計**13校65場10萬6,333**人次

資料時間：113.3.31

校名	場次	人次	校名	場次	人次
南臺科大	32	6,908 (配合校內活動宣導)	崑山科大	2	10,024 (校內電子報宣導)
臺南大學	3	476 (公佈欄海報宣導)	南應科大	6	654 (配合校內活動宣導)
成功大學	5	69,253 (校內電子報宣導)	長榮大學	2	88 (配合校內活動宣導)
臺南護專	3	1,252 (配合校內活動宣導)	華醫科大	4	6,000 (校內電子報宣導)
敏惠護專	3	11,088 (配合校內活動宣導)	嘉藥科大	1	(公佈欄海報宣導)
中信學院	2	240 (配合校內活動宣導)	遠東科大	1	(公佈欄海報宣導)
藝術大學	1	350 (公佈欄海報宣導)			

81

九、大專院校113年3月宣導主題摘錄



路口停讓



非號誌化路口安全



機車安全



酒駕零容忍



82


十、高齡者交通安全教育與宣講



- 截至113年3月，七股區樂齡學習中心開辦「**交通指引樂安全**」課程、東山區樂齡學習中心開辦「**紅燈停、綠燈行、交通安全大家贏**」等課程，共計**9場次**，**188人次**。
- 教育局運用社大、成教班、補校等終身學習管道進行高齡交通安全宣導共計**11場次**，約**600人次**。
- 教育局推動學校長輩交通安全關懷系列宣導，3月主題：**「75歲以上長者每3年要更換駕照」**，**逾274場次**。
- 路老師團隊113年預計4月至各鄰里進行宣講。



簡報結束，敬請指教



監理小組報告

詳參手冊 p.86-99

85

串聯幸福的公路人



臺南市道路交通安全督導會報

監理小組113年3月工作報告

報告機關：嘉義區監理所(臺南、麻豆、新營監理站)

臺南市公共運輸處

113年4月30日



交通部公路局

Highway Bureau, Ministry
of Transportation and
Communications(MOTC)

目 錄

- 壹、鼓勵參加機車安全駕駛訓練計畫
- 貳、大型車視野死角、無號誌及閃光號誌路口、車輛路口停讓等納入駕訓班、初考領講習、道安講習
- 參、優先強化無號誌化路口宣導計畫及大型車視野死角與內輪差實地體驗
- 肆、微型電動二輪車管理與宣導計畫
- 伍、辦理及宣導「主要汽(機)車駕駛人」登錄作業
- 陸、加強市區客運及公路客運「路口停讓」計畫
- 柒、酒後代駕
- 捌、推動與高齡者及交通安全相關之公路公共運輸項目
- 玖、其他交安宣導辦理情形



壹、鼓勵參加機車安全駕駛訓練計畫(1/2)

• 機車駕駛人參與駕訓班之績效

經調查112年度民眾至監理站報名機車考照人數為19,193人，民眾至駕訓班報名人數為1,696人，占比率為8.8%，
113年度截至3月份報名機車駕訓占比率已達8.68%(359/4,138)

年度	107	108	109	110	111	112	113
機車駕訓班	大台南 中山	大台南 中山 大灣	大台南 中山 大灣 成功	大台南 中山 大灣 成功	大台南 中山 大灣 成功 長榮	大台南 中山 大灣 成功 長榮	大台南 中山 大灣 成功 長榮 南凱(籌設中) 日上(籌設中) 麻豆區-台南(籌設中) 新營區-新城(籌設中)
參訓人數	122	422	773	999	1220	1696	359
申請人數		322	694	967	1115	1461	275
補助人數	無補助 計畫	322	670	750(分配) 70(挹注) 共計820人	980(分配) 103(挹注) 共計1,083人	2145(分配) 1,000(市府)	2800(分配)

• 違規行為及追蹤率比較

截至113年度3月份受訓人數359人，違規數2件(0.5%)，違規內容均為駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口紅燈右轉行為，已請駕訓班配合宣導。

壹、鼓勵參加機車安全駕駛訓練計畫(2/2)

• 宣導機車駕駛訓練計畫辦理情形

- 113年度臺南市轄區參與配合推動機車安駕訓練課程共計兩家駕訓班(大台南駕訓班、成功駕訓班)。
- 113年度機車道路安駕計畫台南分配名額為**350**名，預計兩家駕訓班各分配**175**名為目標執行名額。
- 大台南駕訓班預計於113年5月16日辦理第一場機車安駕訓練，另成功駕訓班已完成路線籌備，預計6月份辦理機車安駕訓練。



89

貳、大型車視野死角、無號誌及閃光號誌路口、車輛路口停讓等納入駕訓班、初考領講習、道安講習

- 監理相關講習課程導入無號誌及閃光號誌路口、車輛路口停讓、安全左轉及正確變換車道、大型車視野死角等相關道安教材，並針對事故案例分析。

113年 /3月	機車初考領 安全講習	汽車駕駛人 道安講習	機車駕駛人 道安講習	(未滿18歲) 無照駕駛人 道安講習	酒駕專班 道安講習
場次	128	6	5	4	10
人數	1,454	484	257	191	336

共153場次
2,722人

90

參、優先強化無號誌化路口宣導計畫及大型車視野死角與內輪差實地體驗

- 辦理大型車視野死角體驗活動時，同時宣導及體驗無號誌及閃光號誌路口停讓觀念。
- 深入社區鄰里辦理高齡者安全講座。
 - 宣導地點：七股衛生所、玉井衛生所、楠西衛生所、將軍衛生所、埤頭永安宮、謝樂偉眼科、南化區公所、柳營區太康社區關懷中心、新營區新東社區關懷中心、後壁區頂安社區關懷中心、新營區大宏社區關懷中心。

112年3月份	道安巡迴宣導	高齡者安全講座	大型車視野死角體驗活動
場次	18	11	7
人次	1,612	228	543

共36場次
2,383人



肆、微型電動二輪車管理與宣導計畫(1/2)

- 微型電動二輪車（電動自行車）掛牌納管已於111年11月30日實施領牌三大要件：◎ 要年滿 14歲 ◎ 要登記掛牌 ◎ 要投保 強制責任險
- 推動微型電動二輪車掛牌管理及投保強制險，並提供到點服務加強領牌辦理率，以利後續管理。
- 截至113年3月31日，新車領牌數量已達到3,139輛，使用中車輛領牌數已達到11,098輛，使用中車輛總數19,222輛，使用中掛牌率57%。
- 3月份至電動車經銷商或私人企業辦理領牌服務共6次，領牌數共計119輛；如遇移工申領牌照，會加強宣導微型電動二輪車行車安全。



肆、微型電動二輪車管理與宣導計畫(2/2)

- 執行監警聯合路檢時加強稽查微型電動二輪車及交安宣導，導正民眾應使用符合規定之合法微型電動二輪車，並針對微型電動二輪車違規加強執法，維護微型電動二輪車行車安全。
- 3月辦理微型電動二輪車道路交通安全宣導共計 16 場次、宣導人數 1,516人。
 - 崑山科技大學、大灣高中、七股衛生所、七股國小、玉井衛生所、大山國小、楠西衛生所、將軍衛生所、埤頭永安宮、謝樂偉眼科、南化區公所、新市國中及新營監理站道安講習室.....等。



93

伍、辦理及宣導「主要汽(機)車駕駛人」登錄作業

- 辦理各項車籍異動時，主動登錄主要駕駛人，以落實駕駛人資料之正確性。
 - 登錄主要駕駛人之前，先確認駕駛人是否符合駕駛資格，以杜絕無照駕駛或越級駕駛等情況，保障用路人行車安全。
 - 監理相關講習課程導入各項車籍異動登錄駕駛人等知識，引導正確之駕駛觀念。
 - 赴機關、學校及團體宣導各項車籍異動時登錄主要駕駛人之優點及影響。
- 113年3月份辦理登錄414件。



94

★臺南市公共運輸處工作報告★

陸、加強市區客運及公路客運「路口停讓」計畫

一、業者已提報113年路口停讓訓練計畫。自112年2月起至113年4月止，本處已執行32次共1445車次之市區公車路口停讓稽查，計查獲3件未確實路口停讓案件；另市區客運業者已完成5,907車次自主稽查，計查獲2件未確實路口停讓案件，皆已依規裁處。



二、112年4月28日「大台南公車X新營客運 路口停讓行人優先實境訓練場」正式啟用，截至113年3月止，已完成242人次路口停讓安全教育訓練。

95

柒、酒後代駕績效

三、本市共有4間酒後代駕服務業者，自111年1月起，截至113年4月4日已服務計107,983件。酒後代駕駕駛人推薦作業，截至113年4月4日止，計2間業者完成核備教育訓練課程，服務人數增加至201人，酒後代駕駕駛人推薦標章完成核發22人。

直轄市	服務人數	推薦人數	核發比例
臺北市	1025	136	13.3%
新北市	550	55	10.0%
桃園市	940	36	3.8%
臺中市	373	51	13.7%
臺南市	201	22	10.9%
高雄市	229	22	9.6%

捌、推動與高齡者及交通安全相關之公路公共運輸項目

- 每月定期查核幸福巴士路線營運情形及是否有需改善事項，持續提升服務品質。
- 持續規劃及推動偏鄉高齡者需求路線。
- 本月查核路線：【紅11】、【紅12】、【紅13】、【藍29】、【藍4】、【綠29】、【綠32】、【黃2-1】。



97

玖、其他交安宣導辦理情形

四、113年已協助辦理4場次公車視野死角教育訓練活動。另「公車禮貌新文化」向下紮根活動共辦理8場次，已完成440輛車內宣導海報張貼，已於4月完成1880個站位宣導標語張貼，讓乘客和駕駛能互相尊重、良好互動，進而增進駕駛服務的熱忱及提高民眾搭公車的意願。



98




簡報結束 敬請指教



交通部公路局

Highway Bureau, Ministry
of Transportation and
Communications(MOTC)



宣導小組報告

詳參手冊 p.101-110

4月份 宣導小組成果

101

簡報大綱

- 壹、道路安全宣導成果
 - 一、各類媒體宣導
 - 二、與企業及民間團體合作
 - 三、深入鄉鎮鄰里宣導

102

壹、道路安全宣導成果-各類媒體宣導^{1/2}

3月針對民眾易違規項目

實施精準式宣導主題:**自行車禮讓行人**

1. FB 台南TODAY粉絲頁：4則

觸及人數近2萬人，約500讚數

3/4.11.18.25

2. LINE官方：4則，觸及帳戶共計約4百萬

3. 3/7、11、19、26有線電視台跑馬

4. 新聞稿：3月發布交通主題新聞稿80篇

5. 平面報紙：3月露出主題式新聞57欄



103

壹、道路安全宣導成果-各類媒體宣導^{2/2}

3月針對民眾易違規項目實施精準式宣導

主題 **自行車禮讓行人**

1. 本府各單位官網、LED電子螢幕、CMS、APP宣導

2. 衛生局：東門、林森路戶外大型電子看板，輪播3部道安宣導影片

每部影片每日輪播露出26次，每日共78次

3. 交通局

健康路與西門路口外電視牆輪播道安宣導影片，每日共14次。

海安路停車場外電視牆輪播道安宣導影片，每日共20次。

4. 公運處：固定於10處轉運站播放道安宣導影片

平均每日播放次數約為136次。

5. 監理站：宣導人數共計13場，1366人

健康西門路口



104

壹、道路安全宣導成果-與企業及民間團體合作 1/3

1. 交通局3月至下列地點進行交通安全宣導，共計宣導2,900人次

序	日期	活動主題	地點	宣導人數
1	3月2日(六)	交通安全宣導(擺攤)	新營區體育場	2500
2	3月7日(四)	高齡騎士行動介入方案	新化區東榮社區	50
3	3月13日(三)	交通安全宣導	東區東寧教會	150
4	3月15日(五)	交通安全宣導	東區宏華國際	100
5	3月18日(一)	交通安全宣導	安平區全一電子	50
6	3月21日(四)	交通安全宣導	官田產業行銷中心	50



105

壹、道路安全宣導成果-與企業及民間團體合作 2/3

2. 警察局

3月前往新營育德工家，實施大型車、路口停讓及酒醉模擬眼鏡宣導，向學生宣導留意大型車風險。

接受媒體專訪/擔任主講人，平面及電子媒體共計24場

與校園、機關、公司行號、社團合作83場次宣導

主/合辦25場宣導活動，配合44場活動設攤

3. 社會局

運用電視牆、跑馬燈、遊覽車、村里自強活動、FB進行「請勿酒駕」宣導



106

壹、道路安全宣導成果-與企業及民間團體合作 3/3

4. 監理小組

3月宣導共189場，宣導人數共計5,105人

道安巡迴宣導18場，宣導人數1,612人

高齡者安全講座11場，宣導人數228人

大型車視野死角體驗活動7場，宣導人數543人

機車初考領安全講習128場，宣導人數1,454人

違規道安講習25場，宣導人數1,268人



107

壹、道路安全宣導成果-深入鄉鎮鄰里宣導 1/2

1. 民政局：針對交通安全政令宣導，強化民眾交通安全意識

3月計辦理33場次，32,040人參與。

(1) 透過節慶聯歡聚餐等活動時機宣導，累計16場，26,170人參與。

(2) 藉里鄰長教育訓練、環境清潔日、防災訓練等活動時機宣導，累計17場，5,870人參與。

2. 警察局在將軍胡蘿蔔節設攤，並自繪宣導圖文，向民眾宣導「禮讓行人」、「勿超速」等交通安全觀念。



108

壹、道路安全宣導成果-深入鄉鎮鄰里宣導 2/2

3.消防局

婦女宣導隊，3月共計244場

利用居家訪視時向市民宣導重要道安觀念

4.社會局

3/19利用松柏學苑日語歌曲教唱向長者學員宣導道路安全

3/21、26、27利用社區關懷據點向志工、巡守隊員進行「交通安全須知宣導」


3/13、22結合各區老人福利協進會會員大會向會員宣導道路安全

3/16結合台南市計程車教育輔導協會辦理2024台南有愛，長者行動無礙活動向社區民眾、社區長者宣導道路安全



109

簡報結束
敬請指教



綜管小組報告

詳參手冊 p.112-117



綜管小組工作報告

報告單位：綜管小組
日期：113年4月30日

3月份工作報告事項

工作報告

事故監控

院頒計畫

◆4月16日道路交通事故防制工作圈會議重點

列管工作項目	辦理情形
1 A1事故交通工程改善辦理情形	112年1月份至113年3月份A1事故，共計137件列入交通工程改善，已完成106件，剩餘31件持續於工作圈列管。
2 使用道路施工期間交維計畫審查辦理情形	113年2月審查10案，申請變更執行內容之交維計畫共1案，上述案件皆已審查通過。
3 112年各校校園周邊通學交通路段口需求改善辦理情形(計94校)	1) 協助指揮交通及取締違停需求：計31件已 全數完成 。 2) 路平,遷移障礙物等道路空間不足問題：計4件，已 全數完成 。 3) 增設(或調整)紅綠燈及標誌標線需求：計66件，已完成62件，剩餘4件尚未完成。
4 113年各校校園周邊通學交通路段口需求改善辦理情形(計95校)	1) 協助指揮交通及取締違停需求：計9件，已完成1件。 2) 路平,遷移障礙物等道路空間不足問題：計8件，已完成1件。 3) 增設(或調整)紅綠燈及標誌標線需求：計85件，已完成33件，剩餘52件尚未完成。

113


113年A1事故趨勢監控

工作報告

事故監控

院頒計畫

- 以近3年與去年進行分析，本市今年第一季事故呈現降低趨勢。
- 112年A1事故176人，113年以下降5%以上為年度目標(167人)

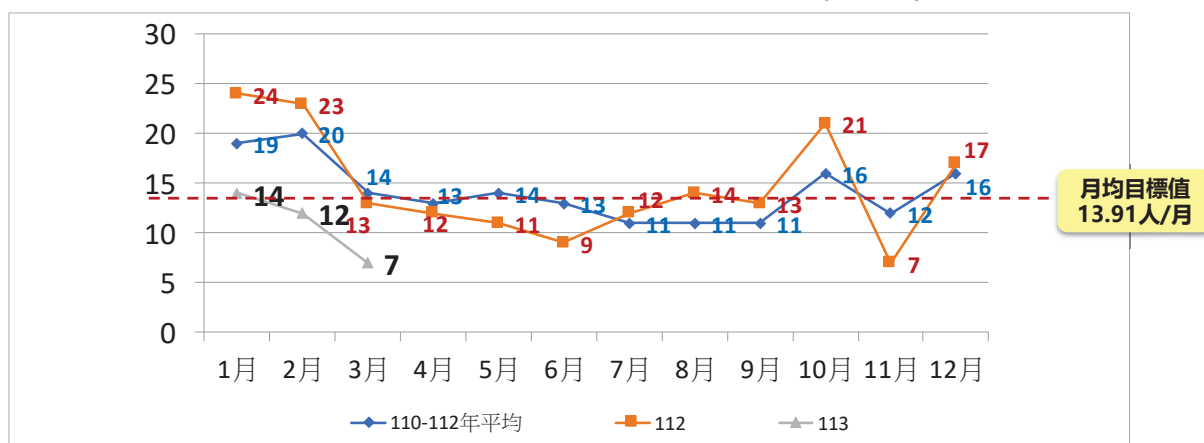


113年A1人數	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
實際值	14	12	7										
目標值	18	23	13	11	11	9	11	14	13	20	7	17	167
差異	-4	-11	-6										
近3年最低值	14	11	13	12	11	9	9	8	9	13	7	12	

114

113年A1事故各行政區監控

工作報告 事故監控 院頒計畫

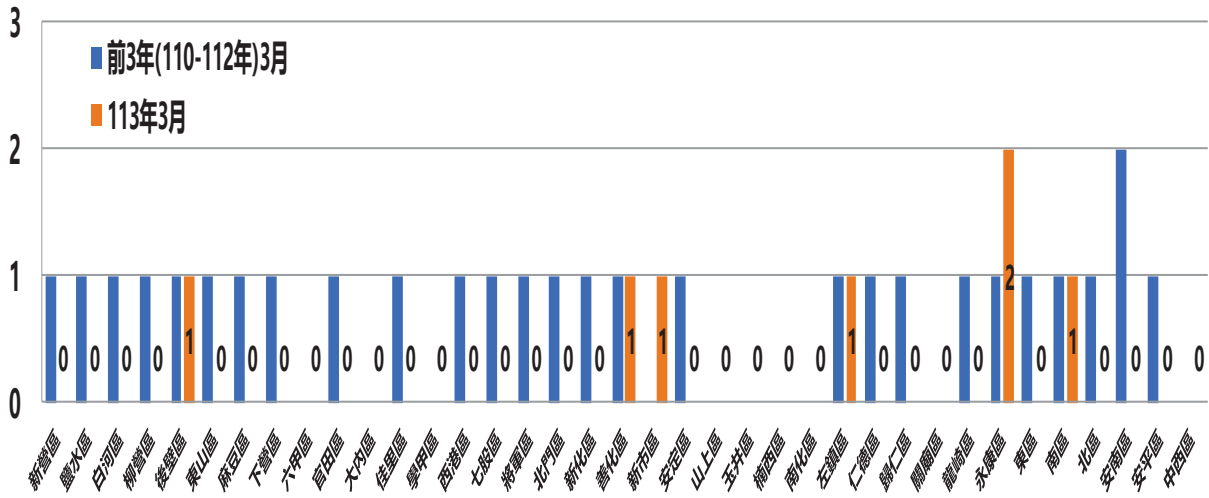


- 113年3月以永康區2人為最高行政區
- 以3年同期進行比較，以新市與永康區+1人、為事故增幅的行政區

院頒方案綜管小組辦理情形

工作報告 事故監控 院頒計畫


項目	考評規定工作內容	執行情形
1 善用道路交通安全觀測指標	1) 依據事故特性，定期監測道安觀測指標訊息，採行各類防制方案 2) 依據交通部所訂每年傷亡指標，訂定縣市控管標準。	1) 根據每月下旬「道安資訊平台」提供30日內死亡人數與各類受傷人數統計等道安指標，納入本市道安工作定期召開重點會議資料，並提供事故改善、道安宣導、新聞稿發布使用。 2) 依據交通部規定，本市113年事故目標30日死亡人數下降5%，經查詢最新統計113年1月減少9人(下降30%)。
2 強化道安會報議事功能	道安會報定期召開，首長應親臨主持與邀請專家學者諮詢。	1) 113年1-3月由市長親自主持本市道安會報3次，並由交通局辦理道安工作圈會議3次。 2) 113年「易肇事路段改善」與「高齡者交通事故防制」，已於2月中旬啟動並於9月底完成期中檢討會議，預計12月底辦理期末成果會議。

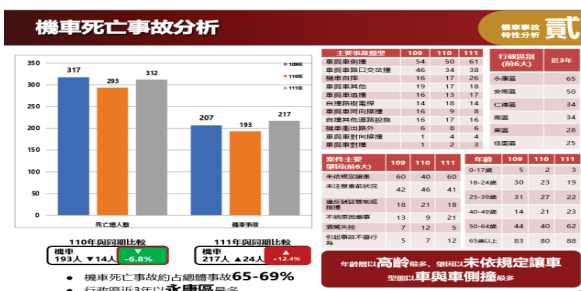


運用道安指標進行機車事故分析

黃市長親自主持道安會報


簡報結束 恭請裁示



臨時動議



兼召集人結論



會議結束，感謝參與

附件

1. A1 事故改善列管追蹤表
2. 車輛相關報表
3. 「行人優先交通安全行動綱領」
辦理情形列管表
4. 本市 112 年針對路口改善預算
執行情況調查表

A1 類事故交通工程改善情形列管追蹤表

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	主辦單位
1	1120105	永康區中正南路 794 號	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請嘉義區監理所於 1 周內邀集業者及相關單位，研擬遷(廢)站期程，並回覆會勘相關單位 2. 盡速完成永安轉運站，以利國道客運業者進駐 	<p>改善事項 1. 已於 112 年 1 月 17 日完成</p> <p>改善事項 2. 預計 113 年 9 月 31 日前完成</p>	<p>交通局 (公運處)</p>
2	1120120-2	永康區中正北路北向車道(高速公路函洞下)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修復高速公路下方涵洞夜間照明設備 2. 研議設置往高速公路車道之可行性 	<p>改善事項 1. 已於 112 年 6 月 30 日完成</p> <p>改善事項 2. 併 AC 路面整修時辦理, 預計 113 年 5 月 31 日前完成</p>	<p>永康區公所(1) 新化工務段(2)</p>
3	1120430	新市區臺 1 線與南 140 線路口	<ol style="list-style-type: none"> 1. 補繪路口模糊標線 2. 汰換路口老舊號誌燈箱 3. 近路口路燈桿張貼反光貼紙 	<p>改善事項 1. 預計 113 年 4 月 30 日前完成</p> <p>改善事項 2. 已於 112 年 6 月 30 日完成</p> <p>改善事項 3. 已於 112 年 6 月 30 日完成</p>	<p>新化工務段(1) 交通局(2) 新市區公所(3)</p>
4	1121011	永康區復興路 69 號前	<ol style="list-style-type: none"> 1. 研議調整車道線型，縮小車道偏移寬度 2. 研議增設科技執法之可行性 	<p>改善事項 1. 已於 113 年 2 月 28 日完成</p> <p>改善事項 2. 永康區復興路與高速一街路口業於 113 年 3 月 8 日邀集相關單位評估單位在案，已納入 113 年協助地方政府建置交通科技執法設備經費需求計畫書，向內政部申請中央統</p>	<p>交通局(1) 警察局(2)</p>

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	主辦單位
				籌分配款項補助程序中。	
5	1121028-2	仁德區保生東路與成功三街路口	路口改為輪放時相管制，俾減少直行車與轉彎車交織	改善事項已列入113年度號誌工程第1次派工優先辦理，預計113年5月31日前完成	交通局
6	1121028-3	安南區公學路五段656巷口	1. 近路口適當處設置岔路標誌 2. 新設閃光號誌配合繪設行人穿越道線、停止線與行車導引線	改善事項 1. 已於 113年 2月 28日 完成 改善事項 2. 已列入113年度號誌工程第1次派工優先辦理，預計113年5月31日前完成	交通局
7	1121125	歸仁區台39線慢車道與大埔路1段口	1. 快車道於號誌桿再增設禁止左轉標誌，並增設告示牌輔以告知用路人至下一處路口左轉 2. 路口南側增繪行穿線	改善事項 1. 2. 預計113年4月30日前完成	新化工務段

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	主辦單位
8	1121130	六甲區菁埔里菁埔59號前(南60線5.1公里處)	1. 南60線交岔路口東西向適當位置處劃設慢字及汰換路口部分老舊輔2標誌 2. 研議增高水泥護欄高度並設置反光片	改善事項 1. 預計 113 年 4 月 30 日前完成 改善事項 2. 預計 113 年 4 月 30 日前完成	六甲區公所
9	1121202-2	白河區昇安里三間厝 8-48 號前	路段側溝增設實體護欄	本局 113 年度將辦理市道 165 線路面改善工程，另將護欄納入設計，目前工程規劃設計中，預計 113 年 10 月底完成改善。	工務局
10	1121214-2	南區西門路一段 382 號前	1. 補繪路口模糊網狀線及轉角紅線等標線 2. 研議增設路燈照明	改善事項 1. 已於 113 年 3 月 31 日完成 改善事項 2. 本局辦理「健康路一段及二段(大同路至中華西路)道路改善工程」，將於事故位置(西門路)新增左轉車偏心車道，屆時路燈一併設置於分隔島上，預計 113 年 12 月 31 日前完成	交通局(1) 工務局(2)
11	1130115-1	安定區未命名市區道路(大同115-5 號附近)路口	補繪北側路段部分已破損模糊減速標線	改善事項預計 113 年 4 月 30 日前完成	交通局

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	主辦單位
12	1130117	官田區南廂里南318線1.5公里處路口	1. 中央分隔島繪設槽化線及近路口兩側適當處增繪減速標線 2. 更新岔路標誌	改善事項 1. 預計 113 年 4 月 30 日前完成 改善事項 2. 預計 113 年 4 月 30 日前完成	官田區公所
13	1130118	麻豆區麻佳路一段 565 號前	分隔島兩側劃設槽化線及麻豆區宏餘鋼鐵股份有限公司前補繪槽化線	改善事項預計 113 年 4 月 30 日前完成	麻豆區公所
14	1130119	新化區荖拔里台 20 線 17K	請新化工務段研議案地前彎道路段原輔 2 標誌變更為 LED 輔 2 標誌	改善事項，經評估在建標案均無 LED 標誌之工項，本案擬先更新輔 2 標誌牌面，俟來年另編列 LED 標誌之工項時再行變更，標誌牌面更新預計 113 年 4 月 30 日前完成	新化工務段
15	1130123-1	白河區白河里康樂路 1 之 91 號前	路口支道增設停字與停止線	改善事項預計 113 年 4 月 30 日前完成	交通局

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	主辦單位
16	1130128	柳營區神農里區道 165 線，近 571087 號路燈桿	近路口兩側適當處增繪慢字及路口增繪行車導引線	改善事項預計 113 年 4 月 30 日前完成	交通局
17	1130129	東區自由路 1 段 322 號前	增設行人早開時相	改善事項預計 113 年 5 月 31 日前完成	交通局
18	1130130	將軍區忠嘉里中興 42 之 6 號前(南 19 線 4.4 公里)處	1. 路段彎道前劃設慢字、機慢車優先道增繪 LOGO 及增設速限標誌 2. 補繪南 19 線 3.5 公里至 4.5 公里路段模糊標線(含停止線、路面邊線、快慢車道分隔線、禁止超車線、分向線)	改善事項 1. 預計 113 年 4 月 30 日前完成 改善事項 2. 預計 113 年 5 月 31 日前完成	將軍區公所 (1) 交通局 (2)
19	1130204-2	下營區茅營里茅港尾 163 號前路口	南 63 線雙向增設慢字、路口行車導引線(轉彎線)，並補繪模糊不清雙黃線與停止線；南 63 線雙向近路口前增設岔路標誌	改善事項預計 113 年 5 月 31 日前完成	下營區公所

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	主辦單位
20	1130215-1	白河區馬稠後里165線9.6公里處	1. 案地路肩區段增設槽化線及市道165線往善主公廟岔路口增設網狀線 2. 近路口轉角處缺口護欄補齊	改善事項 1. 預計 113年5月31日前完成 改善事項 2. 護欄預計 113年5月31日前完成	交通局(1) 工務局(2)
21	1130220	學甲區秀昌里171線5.5公里旁路口	1. 171線近路口適當處兩側各劃設慢字，北向南路口前100公尺劃設速限「60」標字，南向北路口前停止線，車道線及邊線往後退後5公尺以利車輛轉彎 2. 支道劃設停字及停止線 3. 路口劃設網狀線及側溝轉角兩側設置交通安全桿	改善事項 1. 預計 113年5月31日前完成 改善事項 2. 預計 113年5月31日前完成 改善事項 3. 預計 113年5月31日前完成	學甲區公所
22	1130223	新營區嘉芳里復興路748號前	復興路增繪機慢車停等區	改善事項預計 113年5月31日前完成	交通局
23	1130225	永康區鹽水溪河堤道路路燈桿351826號前	研議增設科技執法之可行性	訂於 113年4月15日辦理會勘評估可行性。	警察局

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	主辦單位
24	1130227	永康區中正北路 962-1 號旁	1. 補繪道路模糊快慢車道分隔線、車道線及邊線，以利加強用路人辨識及遵循 2. 研議開啟體一公園路口號誌運作之可行性	改善事項 1. 預計 113 年 4 月 30 日前完成 改善事項 2. 預計 113 年 4 月 30 日前完成	新化工務段(1) 交通局(2)
25	1130304	永康區中正北路與王行路路口	1. 研議路口增設科技執法 2. 重點指示牌面改採 LED 發光型式 3. 補繪路口模糊行穿線、機慢車待轉區、車道線、快慢車道分隔線及邊線等標線 4. 研議台 1 線速限調低之可行性	改善事項 1. 甫簽准下單採購，規劃於該路口南北雙向各設置固定式取締闖紅燈及超速執法設備，及往南行項取締車輛不依車道行駛科技執法。本案施作交貨期 120 天，預計 113 年 7 月間前完工。 改善事項 2. 預計 113 年 6 月 30 日前完成 改善事項 3. 預計 113 年 5 月 31 日前完成 改善事項 4. 預計 113 年 5 月 31 日前完成	警察局(1) 交通局(2, 4) 新化工務段(3, 4)
26	1130305-1	善化區中正路 66 巷與建國路 78 巷口	路口錄案增設科技執法	責請轄區善化分局評估建置固定桿取締超速桿或科技執法可行性後憑辦。	警察局

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	主辦單位
27	1130305-2	後壁區新嘉里 白沙屯 130 之 9 號前路口	1. 增補路口處兩側缺損反光設施及增設「進入社區、減速慢行」告示牌面 2. 協助巡查清除灌溉溝渠周邊雜草	改善事項 1. 預計 113 年 5 月 31 日前完成 改善事項 2. 預計 113 年 5 月 31 日前完成	交通局(1) 農業部農田水利署 嘉南管理處(2)
28	1130308	新市區豐華里 樹谷大道北向 慢車道(距紫棟 路口停止線約 57.8m)	研議快慢車道分隔島增設反光導標	改善事項預計 113 年 6 月 30 日前完成	經濟發展局
29	1130312	永康區鹽水溪 河堤道路路燈 桿 351833 號前	研議增設科技執法之可行性	訂於 113 年 4 月 15 日 辦理會勘評估可行性。	警察局
30	1130321	左鎮區台 20 線 23.5 公里處	1. 台 20 線 23.5K 處附近轉彎處 設置鋼管柱型護欄並請評估於 台 20 線 23.5K 處閃光號誌改為 三色號誌 2. 台 20 線 22K 至 24K 處研議設 置科技執法	改善事項 1. 鋼管柱護欄經評估改為，新增「障礙物體」標誌。預計 113 年 4 月 30 日前完成，另閃光號誌改為三色號誌部分，彙整相關資料陳報公路局雲嘉南區分局同意後辦理。 改善事項 2. 責請轄區新化分局評估建置固定桿取締超速桿或科	曾文工務段 警察局

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈會議裁示改善事項	辦理情形	主辦單位
				技執法可行性後憑辦。	
31	1130323	南區金華路二段 345 巷口	1. 增設岔路標誌及車道指向線 2. 評估取消編號 103 停車格之可行性	改善事項 1. 預計 113 年 5 月 31 日前完成 改善事項 2. 預計 113 年 5 月 31 日前完	交通局

臺南市各型車輛數量區分表

113年3月

區 分	臺南市		
	本月	去年同期	增減
大客車	1,927	1,990	-63
大貨車	13,899	13,823	76
小客車 (含租賃小客車)	626,982	620,645	6,337
計程車	4,170	4,091	79
小貨車 (含租賃及營業小貨車)	89,323	88,985	338
重機車	1,322,908	1,304,254	18,654
輕機車	53,511	58,367	-4,856
拖車	4,808	4,800	8
特種車	5,120	4,981	139
合計	2,122,648	2,101,936	20,712

附註：數量為臺南、麻豆、新營監理站轄管車輛合計

臺南市113年3月份機動車輛成長分析比較表

單位：輛

區分	上月數量	本月數量	本月增加數	成長百分比%
大客車	1,913	1,927	14	0.73
大貨車	13,917	13,899	-18	-0.13
小客車 (含租賃車)	626,243	626,982	739	0.12
計程車	4,150	4,170	20	0.48
小貨車 (含租賃及營業小貨車)	89,282	89,323	41	0.05
重機車	1,321,422	1,322,908	1,486	0.11
輕機車	53,705	53,511	-194	-0.36
拖車	4,820	4,808	-12	-0.25
特種車	5,106	5,120	14	0.27
合計	2,120,558	2,122,648	2,090	0.10

附註：數量為臺南、麻豆、新營監理站轄管車輛合計

台南市政府113年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至113年3月31日止,共27項)

113.3.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、工程	(一)路口行人安全設施改善	1. 行人專用號誌	工程小組(交通局)	80處	0處	0%	於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點、商業密集區附近或多時相號誌重要路口改善行人通行環境，以全面提升行人通行安全。112年度已完成80處，113年預計增設80處。	行人通行安全提升計畫
		2. 行人號誌時相早開	工程小組(交通局)	150處	0處	0%	於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點及商業密集區附近重要路口設置行人綠燈早開，112年度已完成300處，113年預計增設150處。	行人通行安全提升計畫
		3. 行人專用時相	工程小組(交通局)	50處	0處	0%	於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點及商業密集區附近重要路口設置建置行人專用時相，112年度已完成100處，113年預計增設50處。	行人通行安全提升計畫
		4. 標線型人行道	工程小組(交通局)	15處	0處	0%	於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點、車站及商業密集區附近未設置實體人行道道路規劃標線型人行道，112年度已完成30處，113年預計增設15條。	行人通行安全提升計畫

台南市政府113年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至113年3月31日止,共27項)

113.3.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、工程	(一)路口行人安全設施改善	5. 行人庇護島	工程小組 (交通局、工務局)	10處	0處(交通局) 0處(工務局)	0%	112年度本市已完成17處。 交通局:113年預計建置8處行人庇護島。 工務局:113年預計建置2處行人庇護島,目前工程辦理規劃設計中。	行人通行安全提升計畫
		6. 行穿線退縮	工程小組 (交通局、工務局)	15處	0處(交通局) 0處(工務局)	0%	112年度本市已完成39處。 交通局:113年預計建置10處行穿線退縮。 工務局:113年預計建置5處行穿線退縮,目前工程辦理規劃設計中。	道路品質計畫2.0

台南市政府113年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至113年3月31日止,共27項)

113.3.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、工程	(二)改善 既有人行道 改善(優先 改善學校及 公園、運輸 場站周邊人 行道寬不足 90cm)	1. 人行道障礙物 遷移(處) (如電桿、電箱)	工程小組 (工務局)	82處	15處	18%	113年度規劃移除82處,截至113年3月底已完成15處。	
		2. 人行道改善 (如延長、整 平、加寬等)	工程小組 (工務局)	14,823 公尺	8,932公尺	60%	1. 高鐵大道併歸仁大道(高鐵橋下台南段道路旁人行道)改善工程已於113年3月完工,改善長度為1,243公尺。 2. 家齊高中-進學國小通學步道改善工程施工中,已完成1,300公尺預計113年4月底完工。 3. 高鐵沙崙站周邊人行道改善工程,已於113年1月22日完工,施作長度為5,600公尺。 4. 臺南市新營區民治市政中心周邊步道人行環境改善工程,已於113年1月完工,改善長度為789公尺。 5. 臺南市安南區4-11道路工程(北外環至東和橋)施工中,預計113年6月底完工。	
		3. 騎樓整平長度 (公里)-前瞻基 礎建設提升道路 品質計畫2.0)	工程小組 (工務局)	500公尺	209公尺	42%	1. 112年度已完成永康區中華二路、西門路、金華路三段、友愛街、勝利路及開元路共1,191公尺。 2. 113年度目前施作南區國民路路段,永康區中華二路已完成209公尺,預計113年5月底完工。並持續爭取113年度騎樓整平計畫補助經費,已於113年3月23日至國土署簡報。	騎樓整平計畫

台南市政府113年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至113年3月31日止,共27項)

113.3.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、工程	(三)校園週邊暨行車安全道路改善	1.校園周邊路段(口)改善	工程小組(工務局)	35校 (112年度) 25校 (113年度)	29校 (112年度) 0校 (113年度)	83% (112年度) 0% (113年度)	1.112年度共35校辦理通學步道,已完成29校,執行中6校。預定113年6月30日可全數完工。 2.113年度內政部改以「永續提升人行安全計畫」補助各縣市政府辦理人行道工程、通學步道工程、路口安全等改善工程,工務局業於1月18日發函請各區公所及教育局預先準備提案,並依各單位提案初審後,已於113年2月29日提報國土署爭取,目前國土署審核中。	校園周邊暨行車安全道路改善計畫
			工程小組(交通局)	10處	0處	0% 工作進度 60% 辦理設計作業中	1.交通局112年4月28日向交通部公路局申請補助提報新營區太子國中校門口等10處路口改善計畫在案,工程事項包含增設號誌設施、調整號誌時相、增設行人號誌、增繪行穿線及警告標誌等相關交通安全設施。 2.交通部公路局業於10月13日核定本計畫,交通局113年1月4日完成決標,於113年3月12日開工,預計113年6月底前完工。	工作進度:60% 備註: 取得中央補助(10%) 完成議會墊付(10%) 工程發包(20%) <u>工程設計(20%)</u> 工程派工(40%)

台南市政府113年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至113年3月31日止,共27項)

113.3.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
	吾	2. 易肇事路口改善	工程小組 (交通局)	10處 (112年度) 24處 (113年度)	8處 (112年度) 0處 (113年度)	80% (112年度) 0% (113年度)	<p>1. 112年度交通局智安科於112年5月29日函送5大改善路段(口)交通事故現場圖資料至本市道安會報工程小組,本案5大易肇事路段口已於112年8月底會勘完畢,並於9月初完成碰撞構圖繪製及會勘改善規劃事宜,目前已完成8處,工程預計於113年3月底全數完工。</p> <p>2. 國土署112年12月28日核定核定本市24處路口,本計畫中央補助新臺幣3,936萬元整,地方配合款新臺幣864萬元整,核定總經費共計新臺幣4,800萬元整,如於113年底前完工中央將全額補助。本案已於113年3月7日邀請專家學者及相關單位召開路口審查會議,後續修正計畫書後辦理發包事宜。</p>	

台南市政府113年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至113年3月31日止,共27項)

113.3.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、 工程	(四) 行人及高齡友善示範區	推動行人及高齡友善區	工程小組 (交通局)	1處	0處	0%	1. 112年度已完成新營區中正路/武昌街路口等3處路口改善計畫,工程事項包含行穿線退縮、號誌桿汰換、行人燈箱汰換、號誌管線挖掘(線路地下化)、標線重繪等相關交通安全設施。 2. 113年度持續向交通部申請永續提升人行安全計畫,預計建置1處行人及高齡友善區。	
	(五) 減少路側障礙物	路側桿件(含電力桿、燈桿及標誌桿)移除改善	工程小組 (工務局)	16處	16處	100%	113年編列經費施作電桿下地作業,預計施作16處(歸仁十三路),已於113年2月施作完成。	
	(六) 提昇非號誌化路口安全	非號誌路口改善	工程小組 (交通局)	100處	0處	0%	本案已於113年1月底公開招標,2月中決標,113年3月辦理第一次派工。	工作進度:20% 備註: 取得中央補助(10%) <u>完成議會墊付(10%)</u> 工程發包(20%) 工程設計(20%) 工程派工(40%)

台南市政府113年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至113年3月31日止,共27項)

113.3.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
二、教育	(一) 教安教育向前行-扎根學校交通安全教育	1. 高級中等以下學校實施交通安全課程	教育小組(教育局)	550場次	275場次	50%	每校每學期交通安全融入課程1場次。112學年度(上學期)已執行275場次。	112學年度下學期各校課程計畫 113學年度上學期課程計畫
		2. 辦理交通安全課程中小學教師研習	教育小組(教育局)	14場次	4場次	28%	1. 112學年度交通安全教育輔導團暨各校教師專業增能研習計畫112年11月辦理2場次,參與學員預計有150人次。113年3月1日辦理2場次,參與人數154人。 2. 臺南市113年度交通安全教育融入學習領域教學師資培訓實施計畫本局預計辦理1場次。各校申請自辦9場次,共執行10場次,預計113年5月開放申請,6-10月執行。 3. 113學年度交通安全教育輔導團暨各校教師專業增能研習計畫(課程研習)預計於113年11月、114年3月共辦理2場次。 4. 112學年度交通安全教育輔導團-課程模組推廣到校服務截至113年6月預計辦理3場次,已辦理2場次,共80人次參訓。 5. 預計推動教師參加教育部磨課師平臺交通安全線上研習及113年度靖娟兒童安全文教基金會辦理交通安全教育師資研習,截至113年3月31日共計495人次參與。	1. 112、113年度交通安全教育輔導團暨各校教師專業增能研習計畫 2. 臺南市112年度交通安全教育融入學習領域教學師資培訓實施計畫

台南市政府113年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至113年3月31日止,共27項)

113.3.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
	(二) 村里來開講-路老師深入村里宣導	結合路老師與區里及樂齡學習中心合作宣導高齡交通安全	教育小組(教育局)	100場次	0場次	0%	1. 「臺南市甜路路團隊」有31位合格路老師,為推動高齡者的用路安全把關。 2. 以本市65歲以上高齡長者發生交通事故較高區里及樂齡中心為主體辦理,將於本市辦理100場次宣導活動,進行高齡者用路安全宣導,打造高齡者安全友善社會環境,以達社區長輩行為改善效益,落實交通安全正確觀念。	113年臺南市路老師與區里及樂齡學習中心合作宣導高齡交通安全計畫
	(三) 停讓你我他-推廣停讓文化		宣導小組(新聞處)	24檔	8	33%	1. 常年透過不同媒體管道宣導「路口停讓」、「非號誌化路口安全」、「機車安全」、「自行車用路安全」及「高齡者用路安全」等道安主題。 2. 3月份運用臺南TODAY粉絲團、有線電視公用頻道跑馬、本府LINE官方帳號宣導4場,並持續本市轄內各機關官網、電子螢幕、CMS宣導路口停讓安全主題。	

台南市政府113年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至113年3月31日止,共27項)

113.3.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
三、監理	(一) 違規矯正及講習換照	違規矯正及講習換照	監理小組(監理站)	150人	0	0%	自112年7月1日起,初次領有駕駛執照,於發照之日起一年內,有違反道路交通安全規則規定記違規點數達六點,應上道路交通安全講習課程,應上課人數計19人,113年截至3月底已上課人數0人(首梯講習日期113年4月12日)。	
	(二) 機車駕訓加倍推進	擴大機車駕訓補助	監理小組(監理站)	2,800	359	13%	1. 113年機車駕訓補助受理區間為112年12月16日起至113年11月30日,截至113年3月31日參訓人數為359人 2. 本年度目標執行總量嘉義所獲配名額5,300名,台南地區2,800名。	
	(三) 機車道路安駕再提昇	試辦機車道路駕駛訓練	監理小組(監理站)	350	0	0%	1. 113年度機車駕駛訓練制度預計4月份開始,目前有意願配合試辦駕訓班為大台南駕訓班、成功駕訓班。 2. 本年度目標執行總量為350名。	

台南市政府113年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至113年3月31日止,共27項)

113.3.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
三、監理	(四) 違規清理及霸王車牌照追繳	霸王車牌追繳	監理小組 (監理站)	A. 103年~107年註銷車輛收回牌照數：323輛。	至113年3月31日止 A：57輛 B：472輛	A：17.65% B：18.35%	1. 113年公路局考評註銷之牌照收回註銷牌照數目標完成率區間統計：112年10月至113年9月，目標值分2區間訂定之： A. 103年~107年註銷之牌照：臺南地區應繳回車輛數3,230輛，目標完成率10%(即323輛)。 B. 108年~112年註銷之牌照：臺南地區未繳回車輛數5,716輛，目標完成率45%(即2,572輛)。 2. 簡訊及信函通知已註銷車輛之所有人將號牌繳回監理站。 3. 每月排定監警聯合稽查「淨牌專案」，針對行駛中或停放於路邊車輛進行查核註銷號牌車輛使用公用道路之情形，今(113)年度截至3月底，共查獲2輛註銷牌照之車輛。 4. 與臺南市政府警察局、法務部行政執行署台南分署、臺南市政府交通局停車營運科共同建立「台南地區註銷車查報群組」LINE群組，以利停車收費員通報註銷號牌車輛占用停車格，3月份臺南市停管處路邊收費同仁及智慧停車柱系統共通報48件註銷車輛。	
				B. 108年~112年註銷車輛收回牌照數：2,572輛				
	(五) 路口停讓安全有保障	加強路口稽查，確實執行車輛慢看停	監理小組 (監理站)	144	36	25.00%	自113年1月1日起至3月31日止，新營、麻豆及臺南站3站出勤次數共計36次，行經路口車輛計959輛次，並未查獲不符規定之車輛。	
			監理小組 (公運處)	24	6	25.00%	自113年1月1日起至113年3月31日止，本處出勤次數共計6次，行經路口之市區公車車輛計300輛次，並未查獲不符規定之車輛。另112年市區客運業者已完成4,534車次自主稽查。	

台南市政府113年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至113年3月31日止,共27項)

113.3.31

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
四、執法	(一) 加強重點項目執法	1. 路口不停讓行人	執法小組(警察局)	697 (去年同期)	974	139.74%	113年1-3月取締「路口不停讓行人」件數974件,較去年同期697件,增加277件。	年度目標數量(目標值):以去年同期取締件數為目標值。
		2. 非號誌化路口未停車再開	執法小組(警察局)	137 (去年同期)	976	712.41%	113年1-3月取締「非號誌化路口未停車再開」件數976件,較去年同期137件,增加938件。	年度目標數量(目標值):以去年同期取締件數為目標值。
		3. 人行道違規停車	執法小組(警察局)	13092 (去年同期)	463	3.54%	113年1-3月取締「人行道違規停車」件數463件,較去年同期13,092件,減少12,629件。	年度目標數量(目標值):以去年同期取締件數為目標值。
		4. 取締道路障礙	執法小組(警察局)	309 (去年同期)	512	165.70%	113年1-3月取締「取締道路障礙」件數512件,較去年同期309件,增加203件。	年度目標數量(目標值):以去年同期取締件數為目標值。

製表依據:112年5月25日「交通部行人優先交通安全行動綱領」、行政院第3863次會議「交通部行人優先交通安全行動綱領」辦理情形

台南市政府本 112-113 年度針對路口改善預算執行情況調查表
(截至 113 年 04 月 25 日為止)

負責局處	針對路口改善預算執行情況					備註
	市預算金額	爭取中央金額	已執行金額/案件數	尚未執行金額/案件數	後續擬爭取中央金額	
交通局	1,859 萬 7,540 元	1 億 0,573 萬 7,206 元	1,677 萬元/4 件 (已完工案件)	1 億 0,756 萬 4,746 元 /4 件 (執行中案件)	180 萬	案件列表如附件一
工務局	2 億 1,573 萬 7,200 元	5 億 9,323 萬 8,800 元	4 億 7,746 萬元/26 件 (已完工案件)	3 億 3,151 萬 6,000 元 /9 件 (執行中案件)	1 億 6,280 萬元	案件列表如附件二
合計	2 億 3,433 萬 4,740 元	6 億 9,897 萬 6,006 元	4 億 9,423 萬元/30 件 (已完工案件)	4 億 3,908 萬 0,746 元 /13 件	1 億 6,298 萬元	

附件一、臺南市政府交通局 112 年路口改善預算執行情況

項次	工程名稱	經費及來源	改善項目	執行情形
1	院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」112 年度道路交通安全工作執行計畫 無號誌路口交通安全改善計畫	交通部道安會 3,000,000 元。 (中央 1,500,000 元。 市預算 1,500,000 元)	1.將無號誌化路口幹、支道路權劃分明確 2.幹、支道「停」、「慢」標誌標線新設或改善	112/12/1 完工
2	院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」112 年度道路交通安全工作執行計畫 轄區易肇事路段改善計畫	交通部道安會 4,800,000 元。 (中央 2,400,000 元。 市預算 2,400,000 元)	1.西門民族圓環內號誌地下管線予重新配置 2.西門民族圓環內號誌桿件汰換、標誌牌面整併	112/11/29 完工
3	院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」112 年度道路交通安全工作執行計畫 校園及高齡環境週邊路口設置行人專用號誌計畫	交通部道安會 1,000,000 元。 (中央 500,000 元。 市預算 500,000 元)	1.增加行人庇護島、增設行人專用號誌及退縮行人穿越道線 2.調整車道配置，避免直行車輛誤入左轉專用車道	112/12/10 完工
4	行人及高齡者友善路口型示範區補助計畫	交通部道安會 7,970,000 元。 (中央 4,500,000 元。 市預算 3,470,000 元)	提報新營區中正路/武昌街路口等 3 處路口，改善事項包含行穿線退縮、號誌桿汰換、行人燈箱汰換、號誌管線挖掘(線路地下化)、標線重繪等	113/1/15 完工
5	校園周邊暨行車安全道路改善計畫補助計畫 市道 182 線/台 39 線等 4 處易肇事路口改善計畫	內政部營建署 30,690,000 元。 (中央 25,160,000 元。 市預算 5,530,000 元)	提報安南區北安路三段/培安路口等 4 處路口，改善事項包含削切中央分隔島，增設左轉車道、既有設施移設、號誌管線重整、增設行人號誌燈、全路口刨鋪及標線重繪等	預計 113/6/30 完工
6	校園周邊暨行車安全道路改善計畫補助計畫	交通部公路總局 9,440,000 元。 (中央 7,740,800 元。 市預算 1,699,200 元)	提報南 74 線與南 80 線路口等 10 處路口，改善事項包含行穿線退縮、增設行人專用號誌、增設左轉車道、標線重繪等	預計 113/6/30 完工
7	校園周邊暨行車安全道路改善計畫補助計畫(第 2 次補助) 東區東門路三段與自由路二段等 2 處易肇事路口改善計畫	內政部國土署 1943 萬元 (中央 1593 萬 3 千元。 地方 349 萬 7 千元)	提報東區東門路三段與自由路二段等 2 處路口，改善事項包含削切中央分隔島，增設左轉車道、既有設施移設、號誌管線重整、增設行人號誌燈、全路口刨鋪及標線重繪等	預計 113/8/15 完工

8	永續提升人行安全計畫	內政部國土署 4800 萬元	提報南區中華西路一段與新孝路口等 24 處路口，改善事項包含車道瘦身、增設轉車道、擴大路口人行道及建置停等安全空間、增設行人庇護島等	預計 113/11/31 完工
---	------------	----------------	--	-----------------

附件二、臺南市政府工務局 112 年路口改善預算執行情況

項次	工程名稱	經費及來源	改善項目	執行情形
1	濱南路(安平港聯外道路至台 86 線)路面改善工程	市預算 940 萬元	行穿線退縮 1 處	112/7/21 完工
2	後甲國中林森路通學步道及崇德路人行道改善工程	內政部前瞻 800 萬元·(中央 656 萬元·市預算 144 萬元)	Z 字型行穿線 1 處、庇護島 1 處、行穿線退縮 1 處、路口人行道擴大 3 處	112/8/22 完工
3	臺南市白河區公所周邊道路暨環境改善計畫	內政部前瞻 1800 萬元·(中央 1476 萬元·市預算 324 萬元)	行穿線退縮 5 處	112/4/21 完工
4	臺南市麻豆國小通學步道優質化工程	內政部前瞻 770 萬元·(中央 631 萬 4,000 元·市預算 138 萬 6,000 元)	行穿線退縮 1 處	112/5/18 完工
5	臺南市賀建國小通學步道優質化工程	內政部前瞻 790 萬元·(中央 647 萬 8,000 元·市預算 142 萬 2,000 元)	增繪行穿線 3 處、新設行人安全 停等空間 3 處	112/4/23 完工
6	臺南市新市區西拉雅大道提升道路品質計畫工程	內政部前瞻 6,200 萬元·(中央 5,084 萬元·市預算 1,116 萬元)	街角擴大 6 處、行穿線退縮 6 處、Z 字型行穿線 1 處、庇護島 6 處	112/5/5 完工
7	玉井區大成路虎頭山運動公園及周邊環境人行空間改善工程	內政部前瞻 1,800 萬元·(中央 1,476 萬元·市預算 324 萬元)	增繪行穿線 2 處、新設行人安全 停等空間 1 處	112/8/22 完工
8	臺南市政府-民德國中通學步道建置工程	內政部前瞻 1,050 萬元·(中央 861 萬元·市預算 189 萬元)	行穿線退縮 1 處、庇護島 1 處	112/4/21 完工

項次	工程名稱	經費及來源	改善項目	執行情形
9	蘭花生技園區聯外道路路基及路面改善工程	內政部前瞻 1,200 萬元·(中央 984 萬元·市預算 216 萬元)	行穿線退縮 1 處	112/5/19 完工
10	臺南市七股區台 61 線以西至黑面琵鷺賞鳥亭道路改善工程	內政部前瞻 2,300 萬元·(中央 1,886 萬元·市預算 414 萬元)	增設號誌 1 處	112/4/6 完工
11	南化區南化里區里道路聯網路面更新改善工程	內政部前瞻 1,200 萬元·(中央 984 萬元·市預算 216 萬元)	增繪行穿線 2 處	112/3/2 完工
12	臺南市歸仁區紅瓦厝國小通學步道及周邊道路改善計畫	內政部前瞻 660 萬元·(中央 541 萬 2,000 元·市預算 118 萬 8,000 元)	行穿線退縮 5 處	112/4/6 完工
13	安平區州平路及王城路道路改善工程	內政部前瞻 1,150 萬元·(中央 943 萬元·市預算 207 萬元)	行穿線退縮 2 處、新設行人安全停等空間 1 處	112/5/29 完工
14	府前路(南門路至永福路)及忠義路(民生路至府前路)路面改善工程	內政部前瞻 900 萬元·(中央 738 萬元·市預算 162 萬元)	新增左轉車道 1 處	112/7/1 完工
15	學甲區三連路、中正路、中山路道路改善工程	內政部前瞻 4,635 萬元·(中央 3,800 萬 7,000 元·市預算 834 萬 3,000 元)	行穿線退縮 6 處、新設行人安全停等空間 3 處	112/9/26 完工
16	安定區南 131 線(1K+056~1K+235)、南 132 線(0K+890~3K+172) 及 南 134 線(0K+890~1K+625)道路加高及路面改善工程	交通部前瞻 1,454 萬元·(中央 1,192 萬 2,800 元·市預算 261 萬 7,200 元)	行穿線退縮 8 處	112/8/31 完工

項次	工程名稱	經費及來源	改善項目	執行情形
17	西港區南 44 線(0K+710~1K+870)、麻豆區南 49 線 (0K+000~1K+260) 及 南 50 線 (1K+845~2K+460)道路改善工程	交通部前瞻 1,725 萬元·(中央 1,414 萬 5,000 元·市預算 310 萬 5,000 元)	行穿線退縮 1 處	112/9/5 完工
18	臺南市北區文賢國中前人行步道環境品質提升改善工程	內政部前瞻 468 萬元·(中央 383 萬 7,000 元·市預算 84 萬 3,000 元)	行穿線退縮 1 處	112/4/21 完工
19	大區道南 318 線 0K+000~2K+350 道路改善工程	交通部前瞻 3,430 萬 (中央 2,812 萬 6,000 元·市預算 617 萬 4,000 元)	行穿線退縮 1 處	112/1/5 完工
20	佳里區光復路(復興路~文化路)、文化路(延平路~文化西路)、文化西路及七股區南 32 線(文化西路~南 29)等部分路段路面改善工程	市預算 1,838 萬元	行穿線退縮 3 處、庇護島 1 處	112/10/6 完工
21	110 年度-臺南市玉井區玉井工商前人行環境品質提升改善工程	內政部前瞻 700 萬元·(中央 574 萬元·市預算 126 萬元)	行穿線退縮 1 處、庇護島 1 處	112/10/30 完工
22	鹿耳門天后宮周邊道路品質改善及人行環境優化工程	內政部前瞻 890 萬元·(中央 729 萬 8,000 元·市預算 160 萬 2,000 元)	行穿線退縮 1 處、新設行人安全 停等空間 1 處	112/10/3 完工
23	西門路(小北路至民生路)、永福路(永福路二段 211 號至南寧街)及開山路(府前路至樹林街)路面改善工程	市預算 2,350 萬元	新增左轉車道 1 處	112/11/03 完工
24	高鐵沙崙站周邊人行道改善工程	市預算 3,423 萬元(含後續擴充)	行穿線退縮 4 處、庇護島 4 處	現場已完成，辦理變更設計中
25	臺南市歸仁國中及新豐高中學區周邊通學步道改善工程	內政部前瞻 2,730 萬元·(中央 2,238 萬 6,000 元·市預算 491 萬 4,000 元)	行穿線退縮 3 處、路口人行道擴大 2 處	112/10/27 完工

項次	工程名稱	經費及來源	改善項目	執行情形
26	臺南市柳營國小通學步道改善工程	內政部前瞻 556 萬元·(中央 455 萬 9,000 元·市預算 100 萬 1,000 元)	行穿線退縮 1 處、庇護島 1 處	112/12/22 完工
27	善化區建國路人行環境優化工程	內政部前瞻 3,468 萬元·(中央 2,843 萬 7,000 元·市預算 624 萬 3,000 元)	行穿線退縮 5 處、庇護島 4 處、新設行人安全停等空間 5 處	預計 113 年完工
28	臺南市安定區南安國小周邊通學步道改善工程	內政部前瞻 995 萬 6,000 元·(中央 816 萬 3,000 元·市預算 179 萬 3,000 元)	行穿線退縮 4 處、庇護島 1 處、新設行人安全停等空間 4 處	預計 113 年完工
29	臺南市關廟區中山路二段人行道改善工程	內政部前瞻 1,900 萬元·(中央 1,557 萬 9,000 元·市預算 342 萬 1,000 元)	行穿線退縮 2 處、庇護島 2 處	預計 113 年完工
30	家齊高中-進學國小通學步道改善工程	內政部前瞻 2,300 萬元·(中央 1,886 萬元·市預算 414 萬元)	行穿線退縮 7 處	預計 113 年完工
31	臺南市鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程	內政部前瞻 6,385 萬元·(中央 5,235 萬 7,000 元·市預算 1,149 萬 3,000 元)	行穿線退縮 5 處、新設行人安全停等空間 5 處	預計 113 年完工
32	高鐵大道併歸仁大道(高鐵橋下台南段道路旁人行道)改善工程	內政部前瞻 5,410 萬元·(中央 4,436 萬 2,000 元·市預算 973 萬 8,000 元)	行穿線退縮 8 處、庇護島 6 處	113/02/23 完工
33	臺南市歸仁區歸仁國小與國立新豐高級中學周邊通學步道改善工程	內政部前瞻 2,000 萬元·(中央 1,640 萬元·市預算 360 萬元)	行穿線退縮 5 處、新設行人安全停等空間 5 處	預計 113 年完工

項次	工程名稱	經費及來源	改善項目	執行情形
34	中華東路(凱旋路至中華陸橋)道路改善工程	內政部前瞻 1 億 2,530 萬元·(中央 1 億 0,274 萬 6,000 元·市預算 2,255 萬 4,000 元)	行穿線退縮 9 處、庇護島 9 處、新增左轉車道 1 處、路口人行道擴大 9 處	112.9.4 獲核定 1 億 2,530 萬元·簽辦工程發包中
35	安平路(承天橋-中華西路)道路改善工程	內政部 150 萬元·(中央 123 萬元·市預算 27 萬元)	行穿線退縮 3 處、新設行人安全停等空間 3 處	112.12.19 獲核定 150 萬元·先行辦理規劃設計案

附件二、臺南市政府工務局 112 年路口改善的預算執行情況-後續擬爭取中央金額(前瞻計畫)

項次	工程名稱	經費及來源	改善項目	執行情形
1	台南市永康區中華路人行道更新工程(中正南路至小東路間)	爭取中 1 億 6,280 萬元·	行穿線退縮 31 處、庇護島 28 處、新增左轉車道 1 處、路口人行道擴大 33 處	已向公路局提案·爭取中
